LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

Brides N°	Localisation du plan de bride	N° de ligne	Spec.	Diam. de la bride	Observation
1	Sortie PP vers G-07.36	2"PP-X1005	1912	3"	
2	Ligne éthane venant du G-07.34	2"E-X1005	904	1 1/2"	
3	Entrée PP vers E-07.39	2"PP-X1020	1912	3"	
4	Sortie éthane vers G-16.11/13	3"E-X10007	1937	2"	

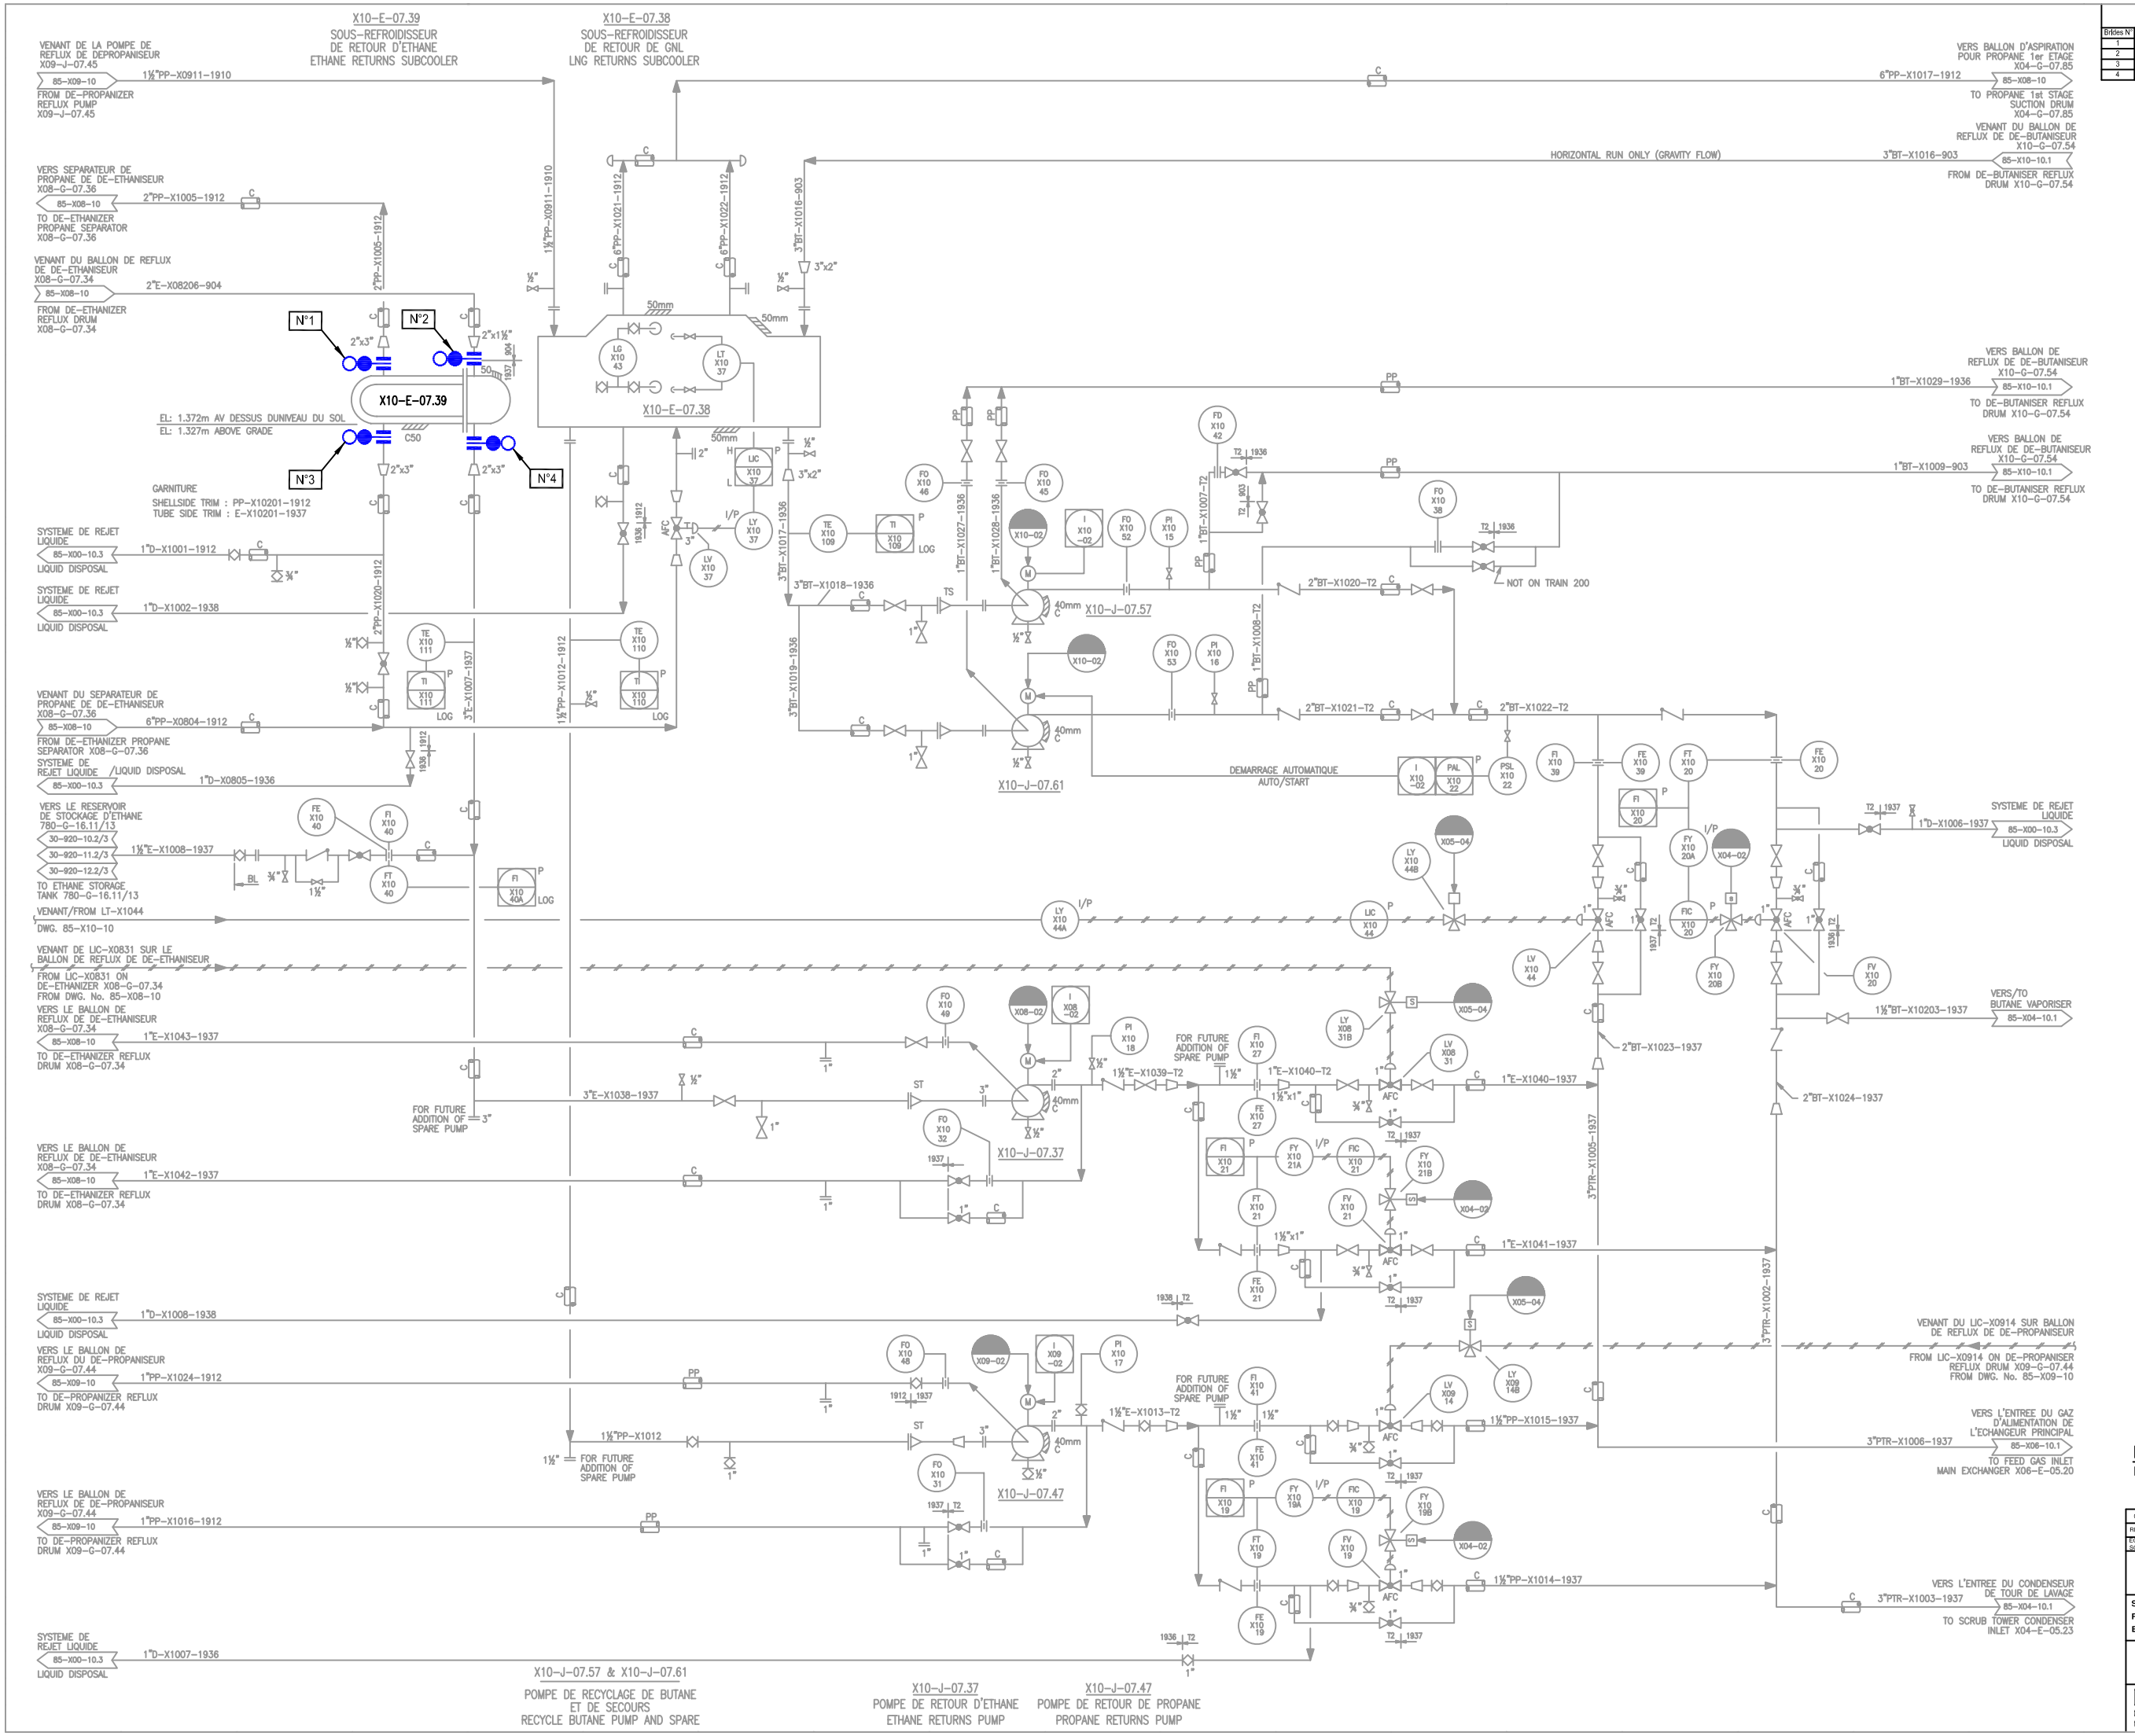

PLAN DE REFERENCE

P&ID 85-X10-10.2

REV.	DATE	REVISION	BY	CHK	SP TO DESIGN	PROJ. ENGIN.	CLIENT
0	02/05/2005	EMIS POUR INSTALLATION	BB				

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B.BOURA — VERIFIE / CHECKED:

S O N A T R A C H
ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINT PLEINS DE L'ECHANGEUR X10-E-07.39

JOB N°	DRAWING N°	REV.
T-1087	DS X10-E-07.39	0

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DE L'ECHANGEUR (X10-E-07.39) POUR TRAVAUX & INSPECTION

Bride N°	Localisation du plan de bride	N° de Ligne	Spécification des brides	Dimensions des brides	Observations	P&ID N°
1	Sortie C3 vers G-07.36	2"PP-X1005	1912	3"		85-X10-10.2
2	Ligne éthane venant du G-07.34	2"E-X08206	904	1 1/2"		85-X10-10.2
3	Entrée C3 vers E-07.39	2"PP-X1020	1912	3"		85-X10-10.2
4	Sortie éthane vers G-16.11/13	3"E-X1007	1937	2"		85-X10-10.2

	DATE	SIGNATURE
DEPARTEMENT TECHNIQUE	07/03/2013	
DEPARTEMENT PRODUCTION	07.03.2013	Dr HELAL
