LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

Brides N°	Localisation du plan de bride	N° de ligne	Spec.	Diam. de la bride	Observation
1	Sortie MEAR vers F-501	4"MEAR-X0103	904	4"	
2	Entrée MEAR vers E-503A	4"MEAR-X0102	904	4"	
3	Sortie MEAL vers E-503A	6"MEAL-X0102	903	6"	
4	Entrée MEAL vers E-503A	6"MEAL-X0101	903	6"	

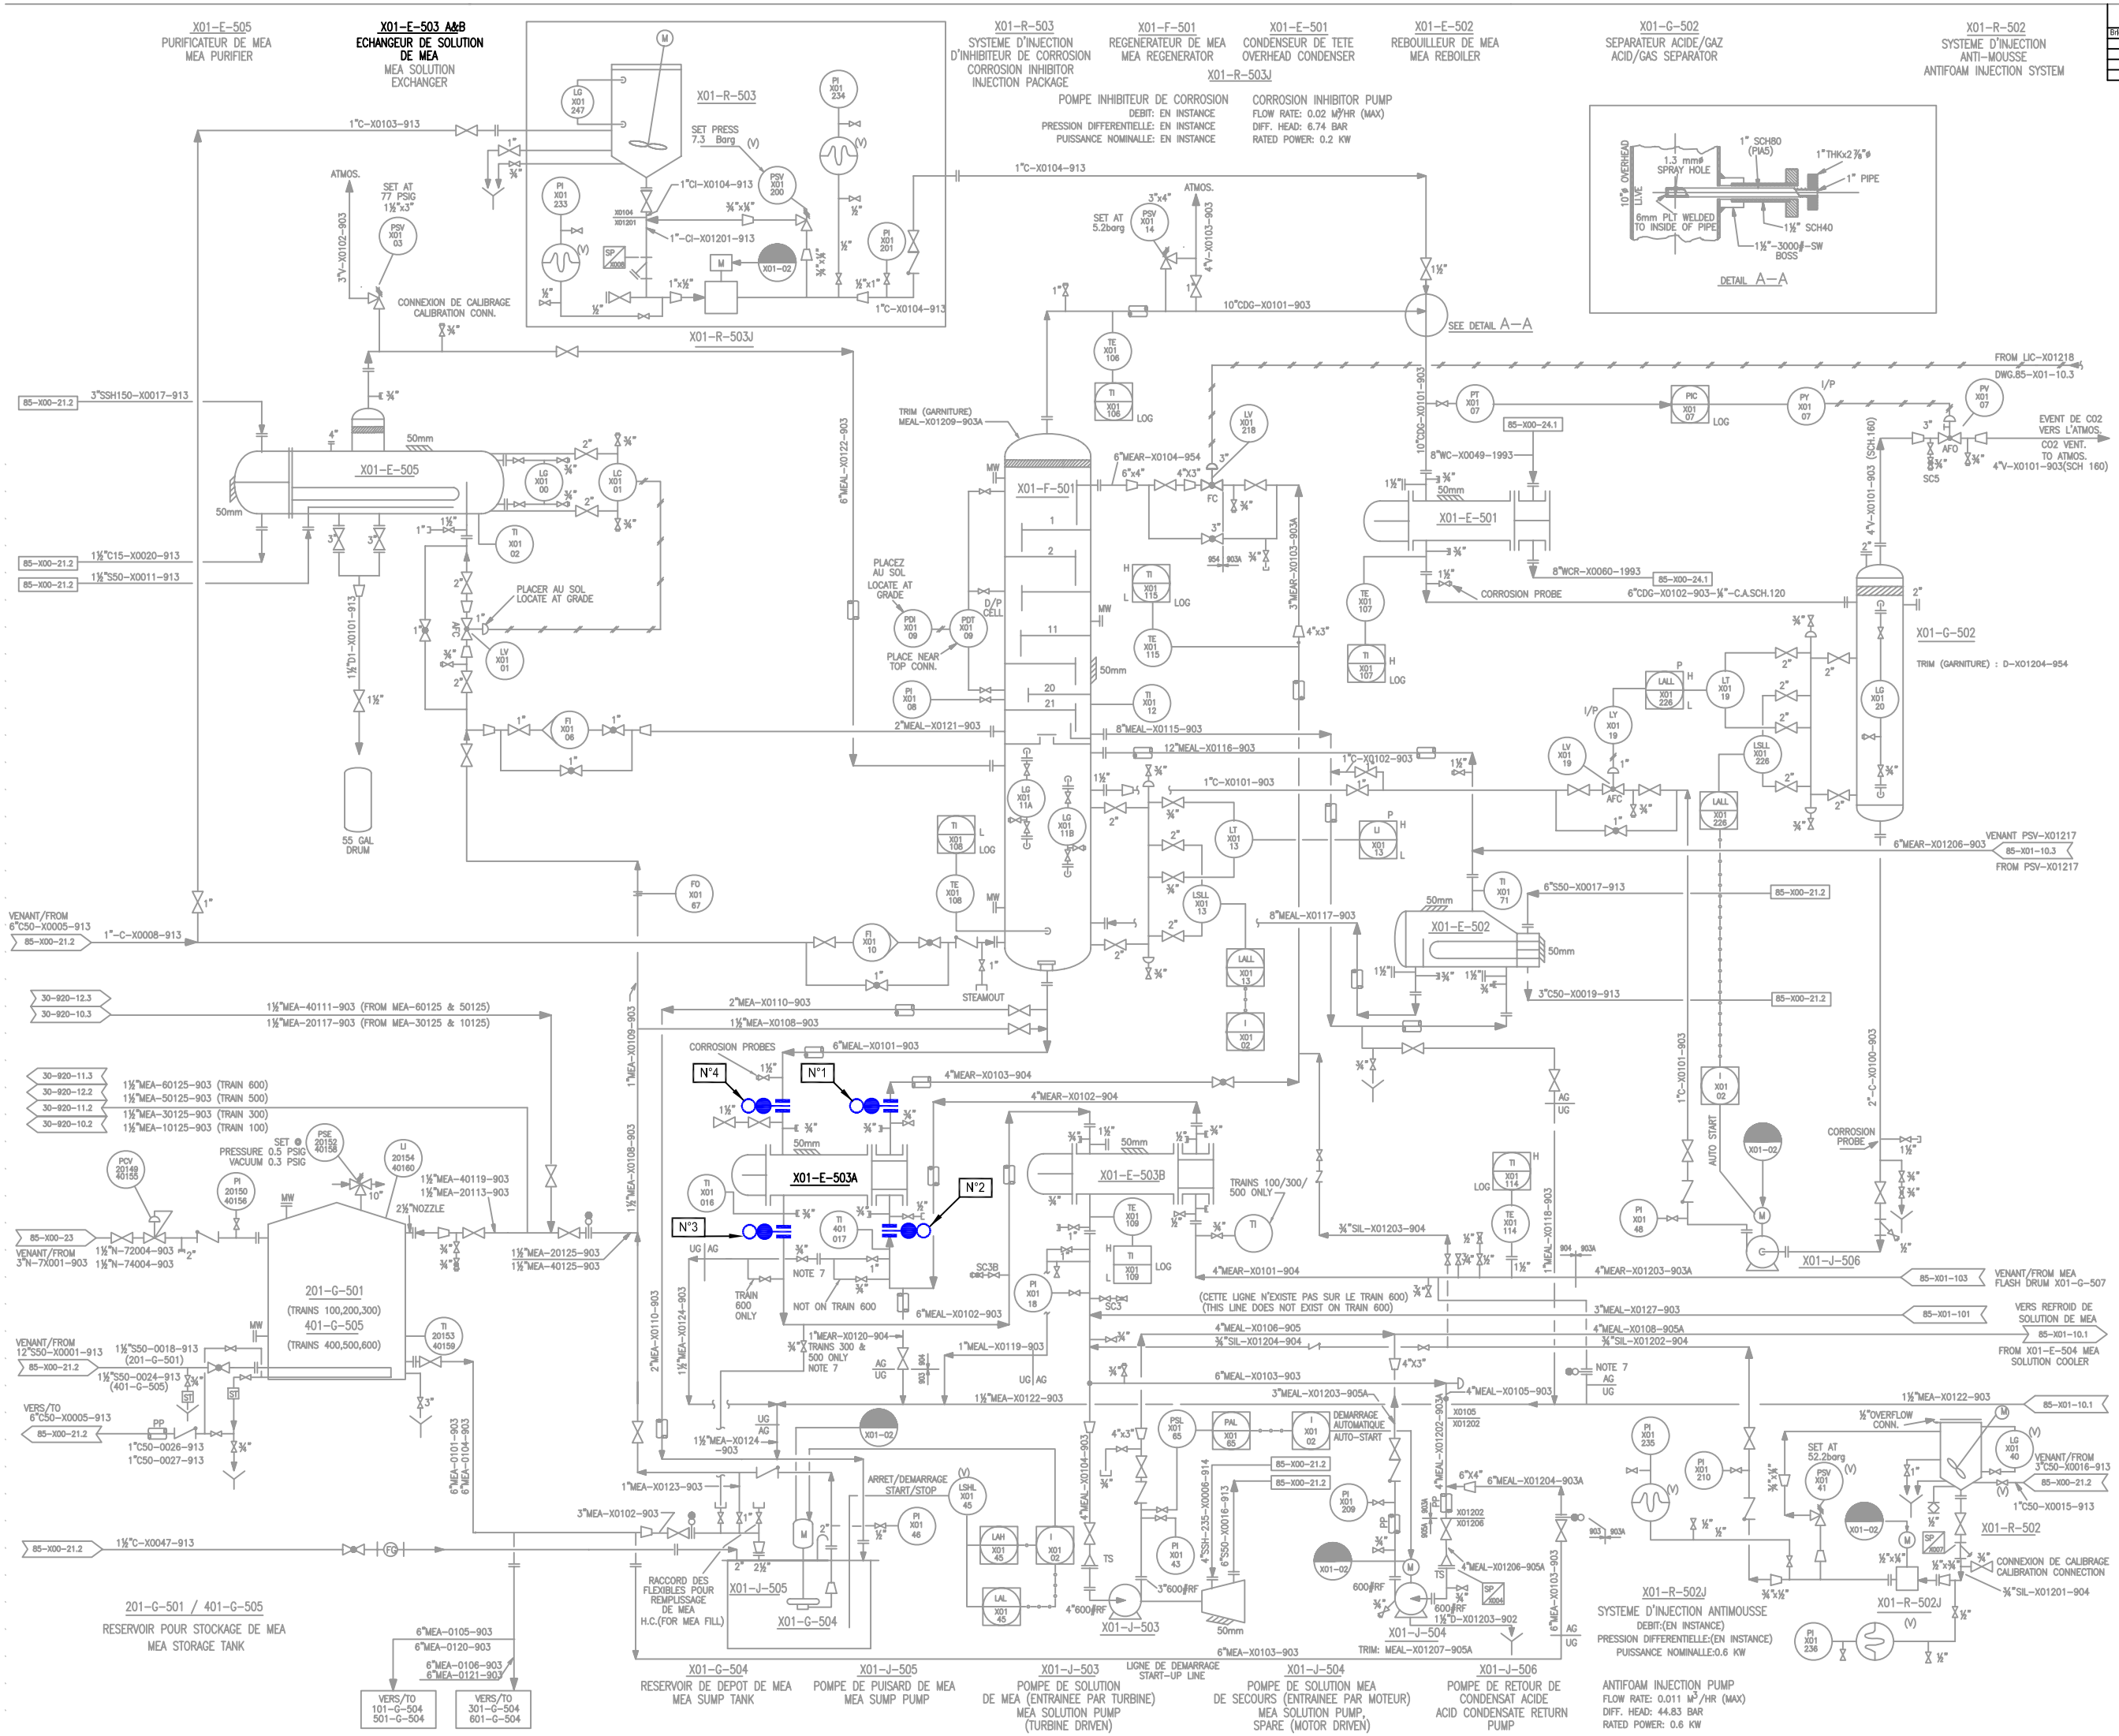

PLAN DE REFERENCE

P&ID 85-X01-10.2

REV.	DATE	REVISION	BY	CHK	OPTG SUPV	DESN ENGR	PROJ ENGR	CLIENT
0	25-05-2005	EMIS POUR INSTALLATION	BB					

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B.BOURA — VERIFIE / CHECKED

S O N A T R A C H
ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINT PLEINS DE L'ECHANGEUR XO1-E-503A

JOB N°	DRAWING N°	REV.
T-1087	DS X01-E-503A	0

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DE L'ECHANGEUR (X01-E-503A) POUR TRAVAUX & INSPECTION

Bride N°	Localisation du plan de bride	N° de Ligne	Spécification des brides	Dimensions des brides	Observations	P&ID N°
1	Sortie MEAR vers F-501	4"MEAR-X0103	904	4"		DS-X01-E-503A Rév0
2	Entrée MEAR vers E-503A	4"MEAR-X0102	904	4"		DS-X01-E-503A Rév0
3	Sortie MEAL vers E-503B	6"MEAL-X0102	903	6"		DS-X01-E-503A Rév0
4	Entrée MEAL vers E-503A	6"MEAL-X0101	903	6"		DS-X01-E-503A Rév0

	DATE	SIGNATURE
DEPARTEMENT TECHNIQUE	04/04/2012	
DEPARTEMENT PRODUCTION	23/04/2012	
