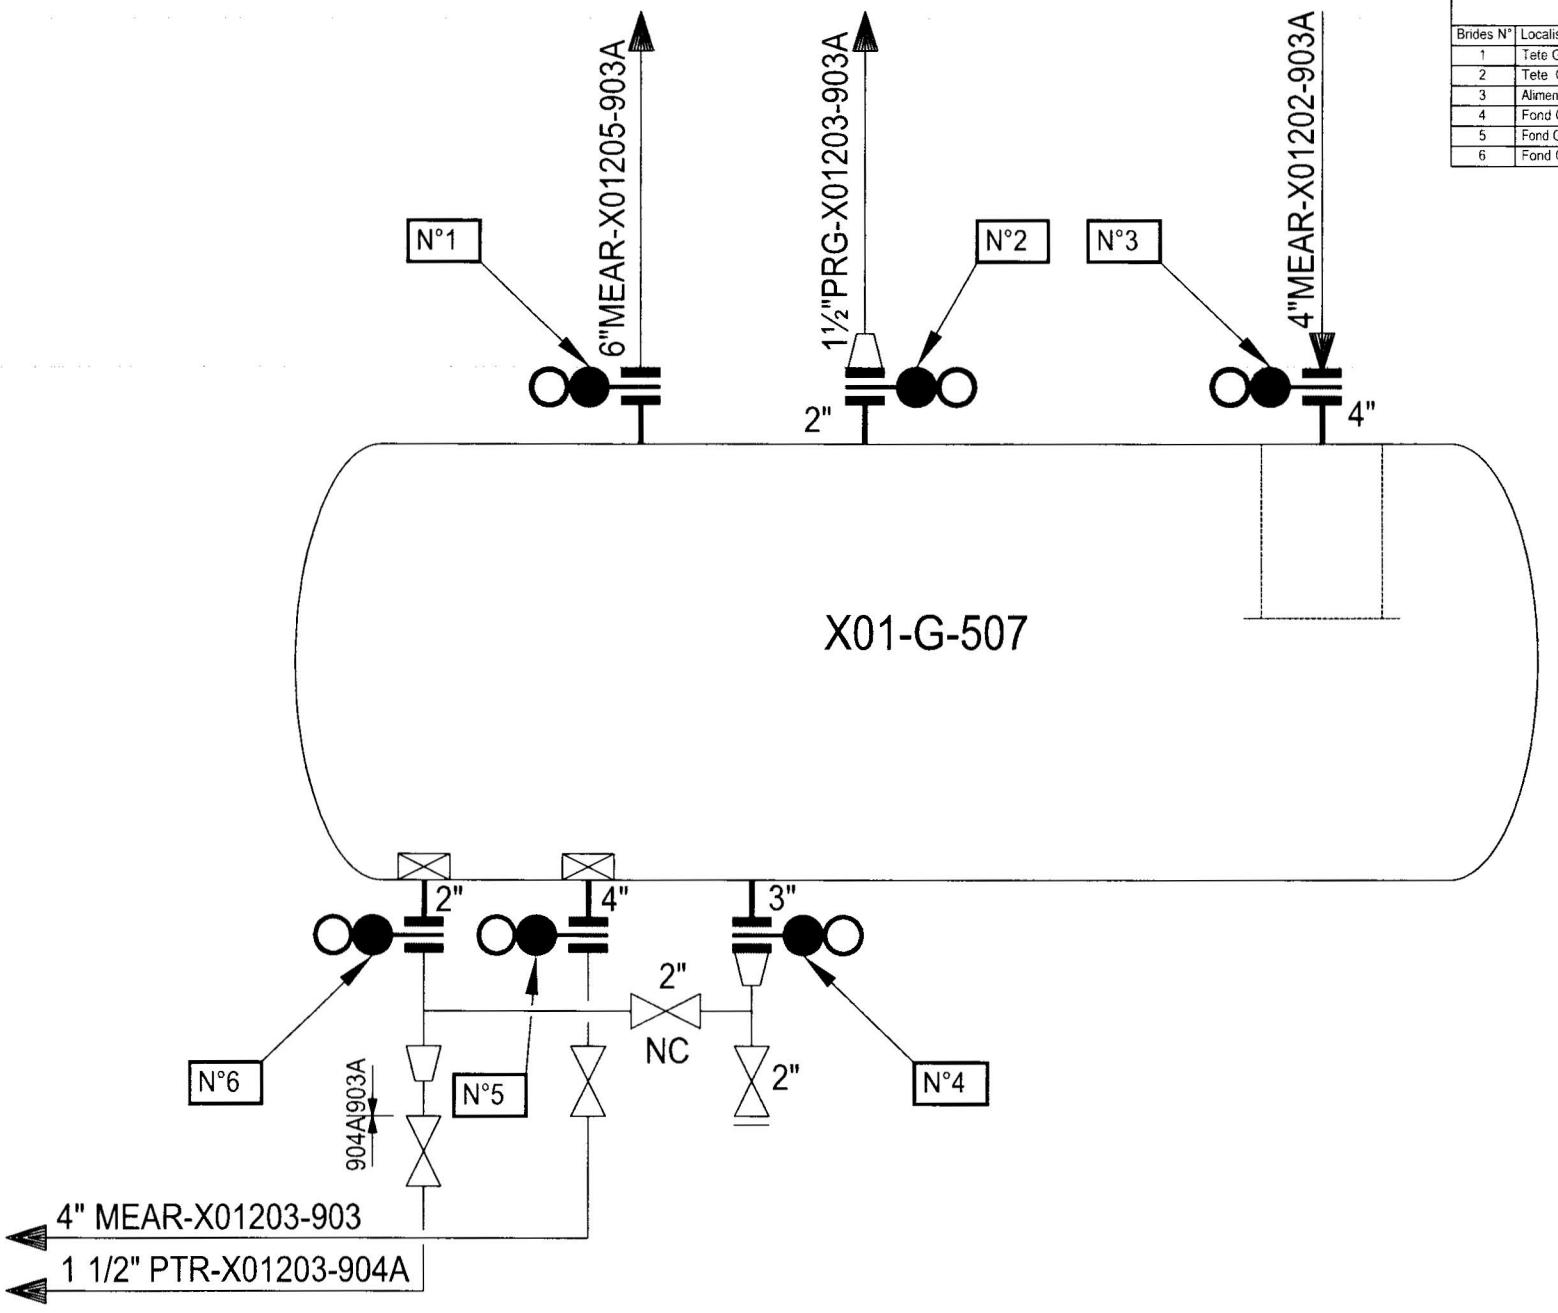

LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

Brides N°	Localisation du plan de bride	N° de ligne	Spec.	Observation
1	Tete G-507 vers F-501	6"MEAR-X01205	903A	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
2	Tete G-507 vers fuel gaz	11/2" PRG-X01203	903A	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
3	Alimentation G-507	4"MEAR-X01202	903A	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
4	Fond G-507 vers decanteur	3"PRG-X01203	904A	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
5	Fond G-507 vers E-503	4"MEAR-X01203	903	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
6	Fond G-507 vers decanteur	"PRG-X01203	904A	Brider au niveau de la tubulure de la colonne

PLAN DE REFERENCE

P&ID 85-X01-10.3

REV	DATE	REVISION	BY	CHK	OPTG SUPV	DESN ENGR	PROJ ENGR	CLIEN
0	21-10 2003	EMIS POUR INSTALLATION	BB					

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B.BOURA — VERIFIE / CHECKED:

S O N A T R A C H

ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

ISOLEMENT PAR SPECTACLE BLIND POUR PENETRATION DU X01-G-507

JOB N	DRAWING N°	REV
T-1087	DS X01-G-507	0

Liste des brides d'isolement du X01-G-507 pour pénétration

Bride N°	Localisation du plan de bride	N° de Ligne	Spécification des brides	Dimensions des brides	Observation	P&ID N°
1	Tête G-507 vers F-501	6"MEAR-X01205	903A	6"		DS-X01-G-507 Rév0
2	Tête G-507 vers fuel gaz	11/2"PRG-X01203	903A	1 1/2"		DS-X01-G-507 Rév0
3	Alimentation G-507	4"MEAR-X01202	903A	4"		DS-X01-G-507 Rév0
4	Fond G-507 vers décanteur	3" PRG-X01203	904A	3"		DS-X01-G-507 Rév0
5	Fond G-507 vers E-503	4"MEAR-X01203	903	4"		DS-X01-G-507 Rév0
6	Fond G-507 vers décanteur	2"PRG-X01203	904A	2"		DS-X01-G-507 Rév0

NB : Les brides(4) et (6) sont piquées sur la ligne 11/2"PTR-X01203 après réduction.

	DATE	SIGNATURE
DEPARTEMENT TECHNIQUE	09/04/2012	
DEPARTEMENT PRODUCTION	28/04/2012	
