LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

Brides N°	Localisation du plan de bride	N° de ligne	Spec	Observation
1	Tête F-501 vers F-501	10"CDG-X0101	903	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
2	Admission MEA vers F-501	6"MEAR-X0104	954	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
3	F-501 vers E-502	8"MEAL-X0115	903	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
4	Retour vapeur E-502 vers F-501	12"MEAL-X0116	903	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
5	Reflux vers F-501	1"C-X0101 ...	903	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
6	Retour liquide E-502 vers F-501	8"MEAL-X0117	903	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
7	Fond F-501 vers E-503A	6"MEAL-X0101	903	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
8	Appoint condensat vers F-501	1"C-X0008	913	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
9	Retour E-505 vers F-501	6"MEAL-X0122	903	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
10	F-501 vers E-505	2"MEAL-X0121	903	Brider au niveau de la tubulure de la colonne

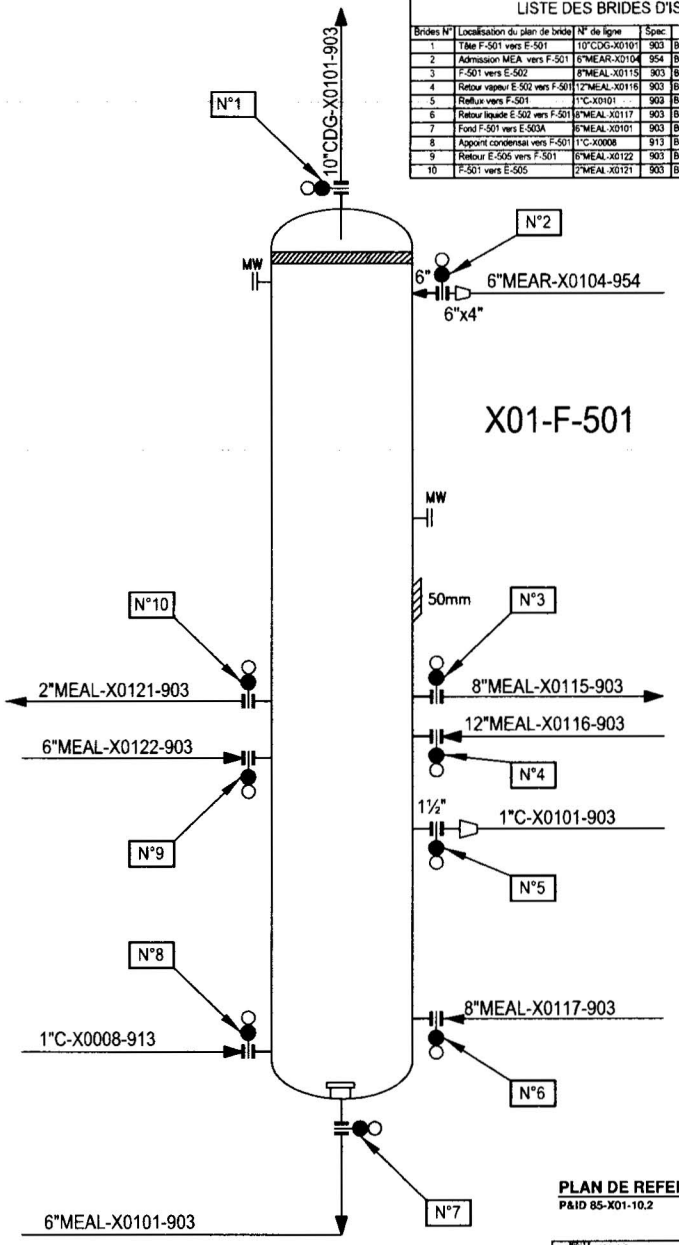

PLAN DE REFERENCE

P&ID 85-X01-10.2

REV	DATE	REVISION	BY	CHK	APPROVED	PROJ. MANAGER	CLIENT
1	18-11-00	MISE A JOUR	B.Y			MD	
0	27-06-00	EMIS POUR INSTALLATION	BB				

DESIGNED: NOMS — DRAWN: B.YETTOU — CHECKED: M.DINEDANE — SCALE:

S O N A T R A C H

ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

ISOLEMENT PAR SPECTACLE BLIND
POUR PENETRATION
DU X01-F-501

JOB N°	DRAWING N°	REV.
T-1087	DS X01-F-501	1

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DE COLONNE REGENERATION (X01-F-501) POUR TRAVAUX & INSPECTION

Bride N°	Localisation du plan de bride	N° de Ligne	Spécification des brides	Dimensions des brides	Epaisseurs des brides (mm)	Observations	P&ID N°
1	Tête F-501 vers E-501	10" CDG-X0101	903	10"			DS X01-F-501 Rév 1
2	Admission MEA vers F-501	6"MEAR-X0104	954	6"			DS X01-F-501 Rév 1
3	F-501 vers E-502	8"MEAL-X0115	903	8"			DS X01-F-501 Rév 1
4	Retour vapeur E-502 vers F-501	12"MEAL-X0116	903	12"			DS X01-F-501 Rév 1
5	Reflux vers F-501	1"C-X0101	903	1 1/2"			DS X01-F-501 Rév 1
6	Retour liquide E-501 vers F-501	8"MEAL-X0117	903	8"			DS X01-F-501 Rév 1
7	Fond F-501 vers E-503A	6"MEAL-X0101	903	6"			DS X01-F-501 Rév 1
8	Appoint condensât vers F-501	1"C-X0008	913	1"			DS X01-F-501 Rév 1
9	Retour vapeur E-505 vers F-501	6"MEAL-X0122	903	6"			DS X01-F-501 Rév 1
10	F-501 vers E-505	2"MEAL-X0121	903	2"			DS X01-F-501 Rév 1

	DATE	SIGNATURE
DEPARTEMENT TECHNIQUE	09/04/2012	
DEPARTEMENT PRODUCTION	21/04/2012	
