LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

Brides N°	Localisation du plan de bride	N° de ligne	Spec.	Observation
1	Tête F-502 vers E-521	20"PRG-X0113	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
2	Eau de lavage vers F-502	4"WGA-X01202	905A	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
3	Eau de lavage F-502 vers J-510/511	6"WGA-X01203	905A	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
4	Admission MEA vers Absorbeur	4"MEAL-X01110	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
5	Fond F-502 vers décanteur	11/2"PTR-X0101	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
6	Admission gaz vers séparateur fond	20"PRG-X0110	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
7	Sortie gaz séparateur vers E-506	20"PRG-X0111	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
8	Retour MEA F-502 vers G-507	4"MEAR-X0101	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
9	Admission gaz vers F-502	20"PRG-X0112	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne

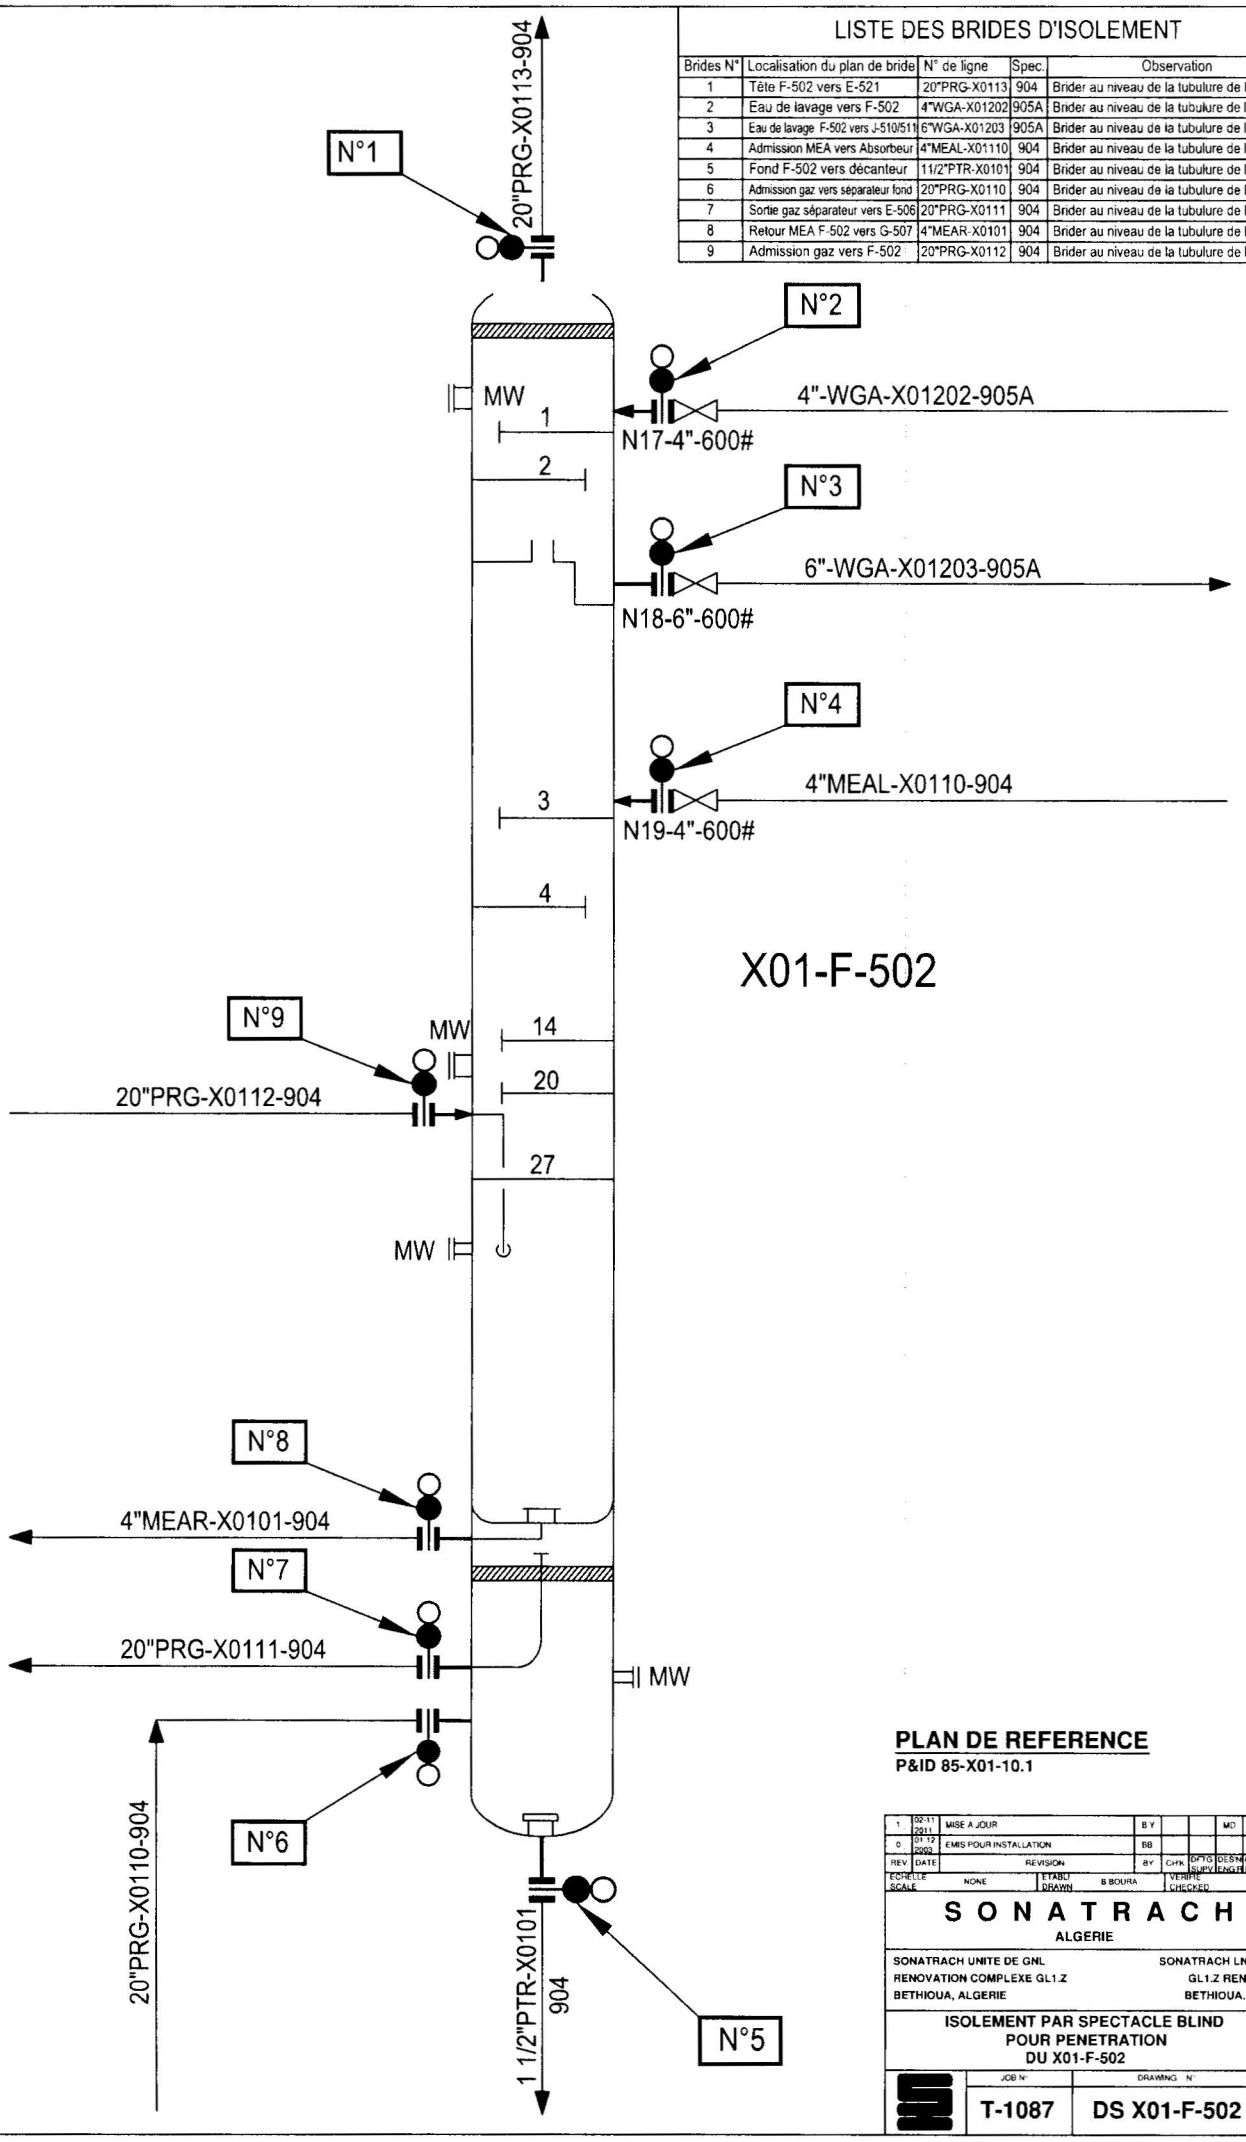

PLAN DE REFERENCE
P&ID 85-X01-10.1

REV	DATE	REVISION	BY	CHK	DPTG SUPV	DESIG ENG	PROJ ENGR	CLIENT
1	02-11 2011	MISE A JOUR	B Y			MD		
0	01 12 2002	EMIS POUR INSTALLATION	BB					

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B BOURA — VERIFIE / CHECKED:

S O N A T R A C H
ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

ISOLEMENT PAR SPECTACLE BLIND POUR PENETRATION DU X01-F-502

JOB N°	DRAWING N°	REV
T-1087	DS X01-F-502	1

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DE COLONNE ABSORPTION (X01-F-502) POUR TRAVAUX & INSPECTION

Bride N°	Localisation du plan de bride	N° de Ligne	Spécification des brides	Dimensions des brides	Epaisseurs des brides (mm)	Observations	P&ID N°
1	Tête F-502 vers E-521	20"PRG-X0113	904	20"			DS X01-F-502 Rév 1
2	Eau de lavage vers F-502	4"WGA-X01202	905A	4"			DS X01-F-502 Rév 1
3	Eau de lavage F-502 vers J-510/511	6"WGA-X01203	905A	6"			DS X01-F-502 Rév 1
4	Admission MEA vers Absorbeur	4"MEAL-X0110	904	4"			DS X01-F-502 Rév 1
5	Fond F-502 vers décanteur	11/2"PTR-X0101	904	1 1/2"			DS X01-F-502 Rév 1
6	Admission gaz vers séparateur fond	20"PRG-X0110	904	20"			DS X01-F-502 Rév 1
7	Sortie gaz séparateur vers E-506	20"PRG-X0111	904	20"			DS X01-F-502 Rév 1
8	Retour MEA F-502 vers G-507	4"MEAR-X0101	904	4"			DS X01-F-502 Rév 1
9	Admission gaz vers F-502	20"PRG-X0112	904	20"			DS X01-F-502 Rév 1

	DATE	SIGNATURE
DEPARTEMENT TECHNIQUE	03/04/2012	
DEPARTEMENT PRODUCTION	28/04/2012	
