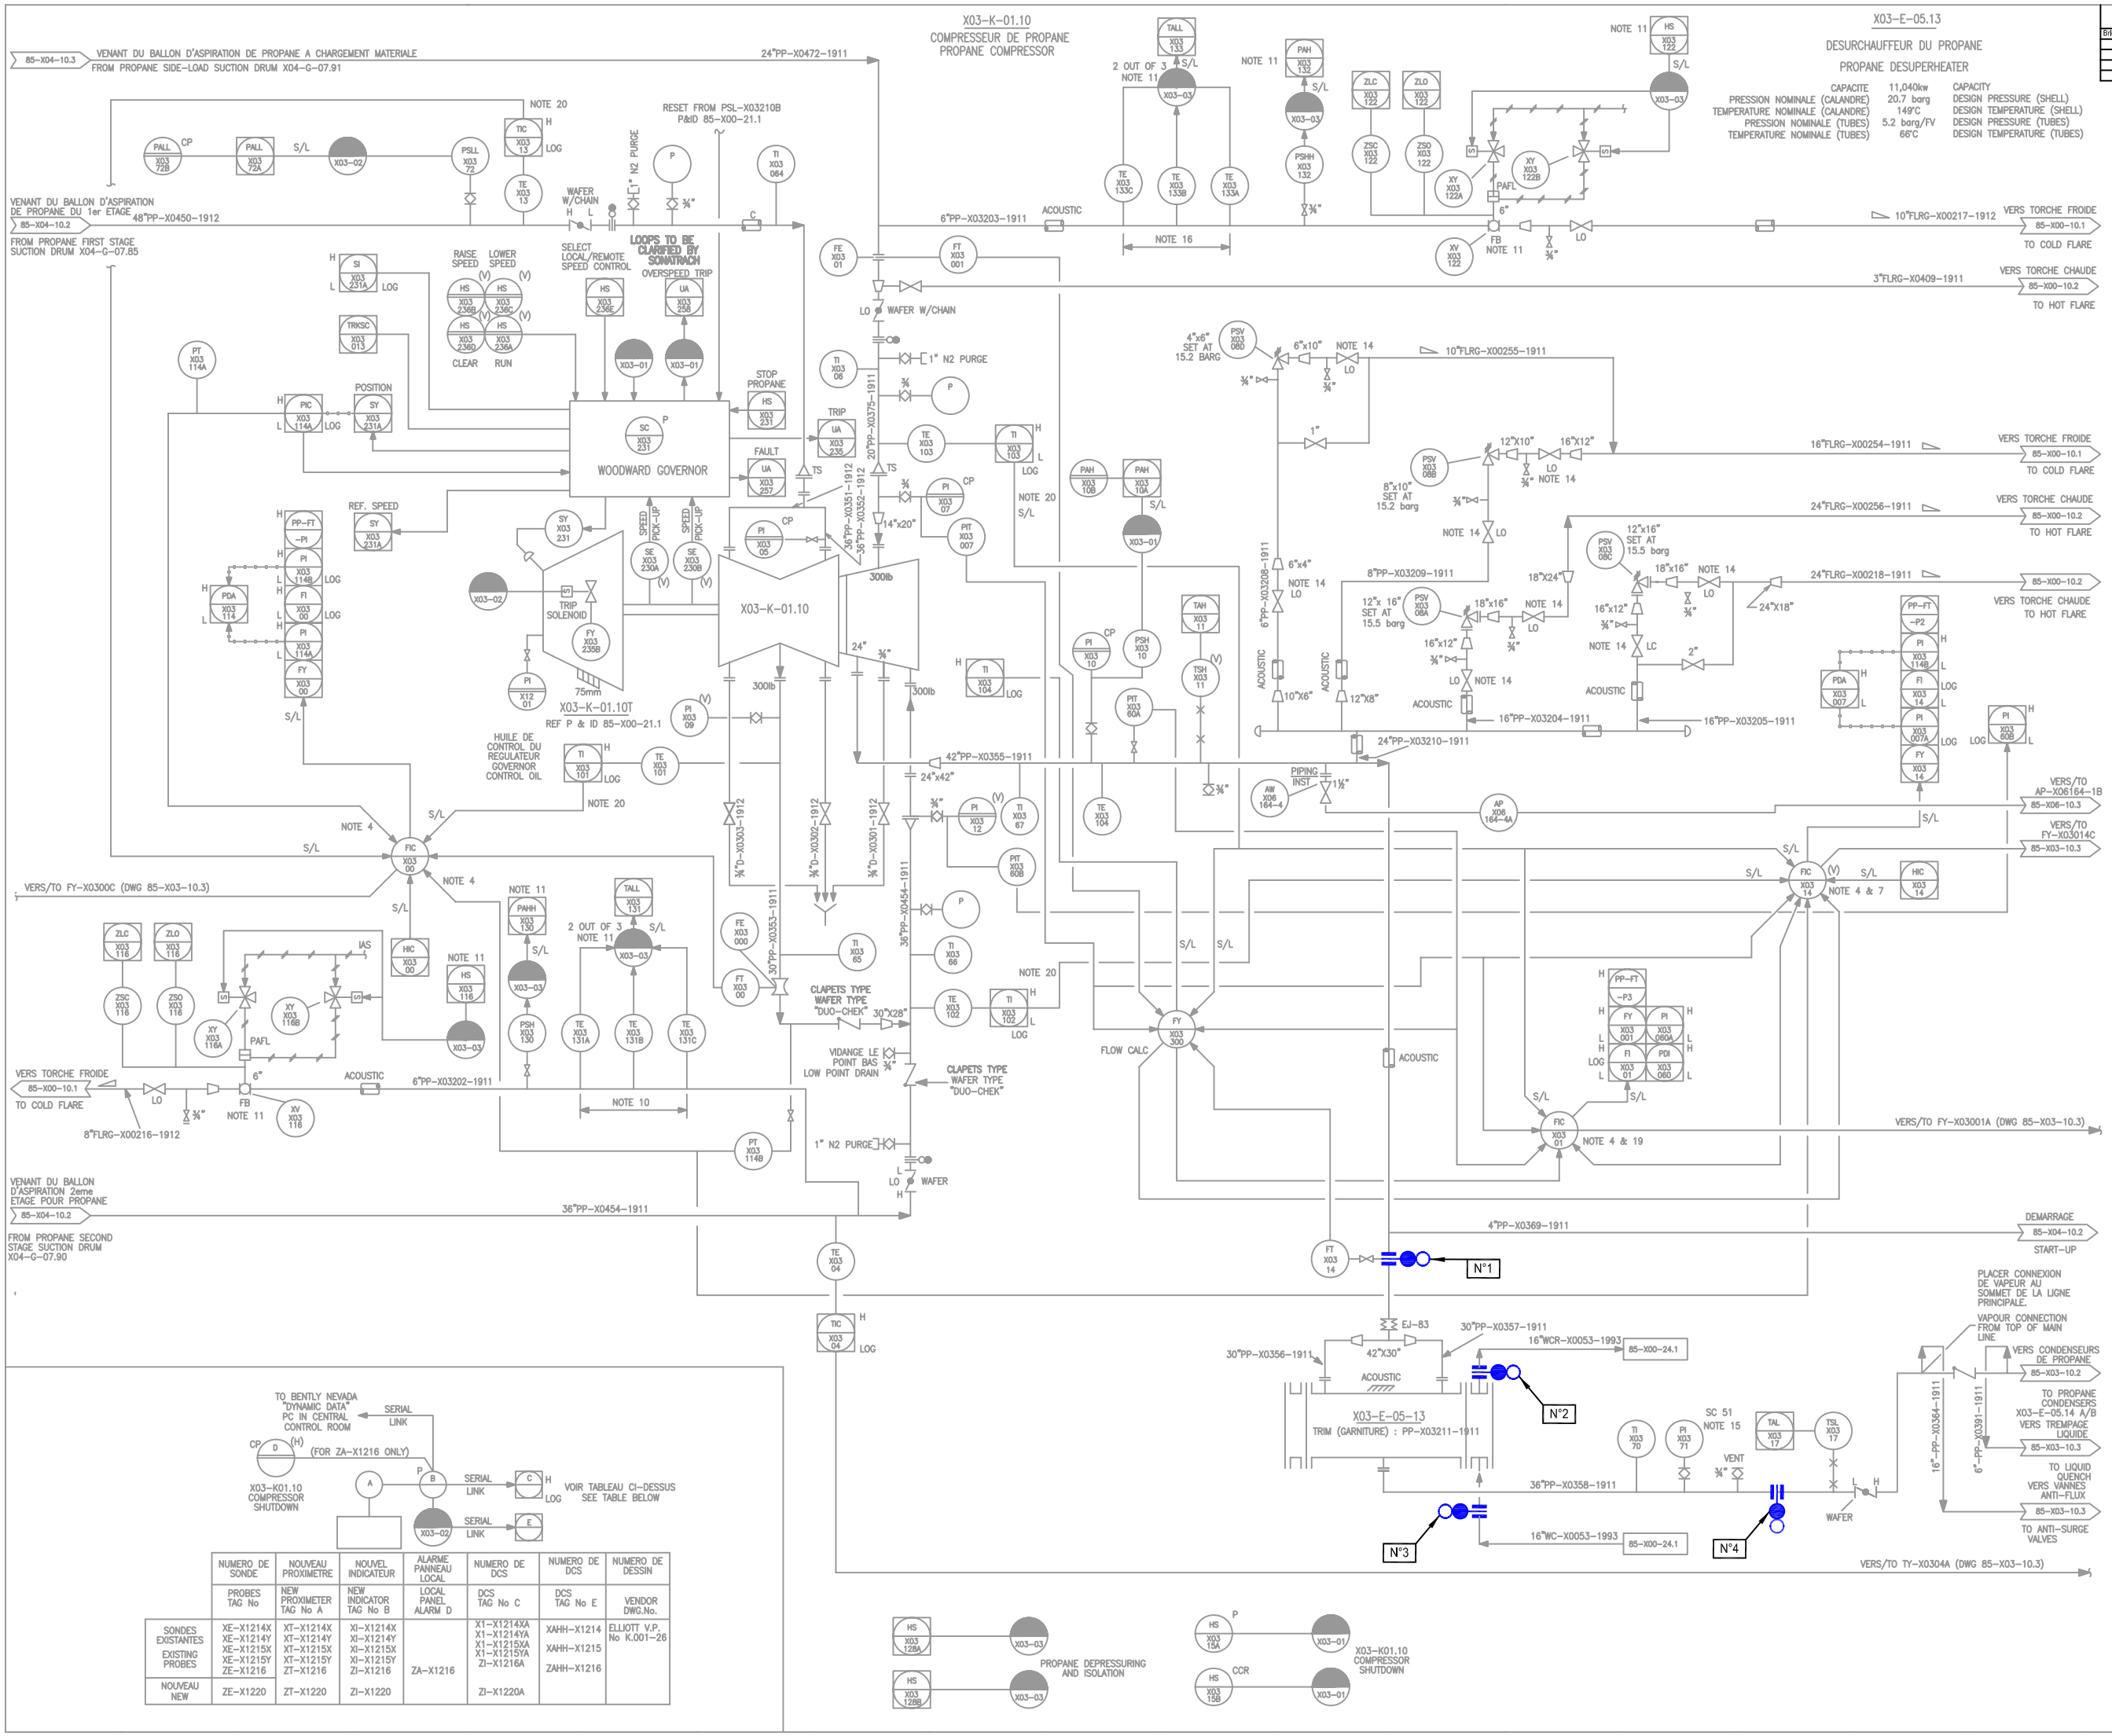

	NUMERO DE SONDE	NOUVEAU PROXIMETRE	NOUVEL INDICATEUR	ALARME PANNEAU LOCAL	NUMERO DE DCS	NUMERO DE DCS	NUMERO DE DESSIN
	PROBES TAG No	NEW PROXIMETER TAG No A	NEW INDICATOR TAG No B	LOCAL PANEL ALARM D	DCS TAG No C	DCS TAG No E	VENDOR DWG.No.
SONDES EXISTANTES EXISTING PROBES	XE-X1214X XE-X1214Y XE-X1215X XE-X1215Y ZE-X1216	XT-X1214X XT-X1214Y XT-X1215X XT-X1215Y ZT-X1216	XI-X1214X XI-X1214Y XI-X1215X XI-X1215Y ZI-X1216	ZA-X1216	X1-X1214XA X1-X1214YA X1-X1215XA X1-X1215YA ZI-X1216A	XAHH-X1214 XAHH-X1215 ZAHH-X1216	ELLIOTT V.P. No K.001-26
NOUVEAU NEW	ZE-X1220	ZT-X1220	ZI-X1220		ZI-X1220A		

LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

Brides N°	Localisation du plan de bride	N° de ligne	Spec.	Diam. de la bride	Observation
1	Entrée propane vers E-05.13	42"PP-X0355	1911	42"	
2	Sortie E.D.M.	16"WCR-X0053	1993	16"	
3	Entrée E.D.M. vers E-05.13	16"WC-X0053	1993	16"	
4	Sortie propane vers E-05.14A/B	36"PP-X0358	1911	36"	

PLAN DE REFERENCE

P&ID 85-X03-10.1

REV.	DATE	REVISION	BY	CHK	SP TO DESIGN ENGIN.	PROJ ENGIN.	CLIENT
0	15/05 2005	EMIS POUR INSTALLATION	BB				

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B.BOURA — VERIFIE / CHECKED:

S O N A T R A C H
ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINT PLEINS DE L'ECHANGEUR X03-E-05.13

JOB N°	DRAWING N°	REV.
T-1087	DS X03-E-05.13	0

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DE L'ECHANGEUR (X03-E-05.13) POUR TRAVAUX & INSPECTION

Bride N°	Localisation du plan de bride	N° de Ligne	Spécification des brides	Dimensions des brides	Observations	P&ID N°
1	Entrée propane vers E-05.13	42''PP-X0355	1911	42''		DS X03-E-05.13 Rév 0
2	Sortie E.D.M.	16''WCR-X0053	1993	16''		DS X03-E-05.13 Rév 0
3	Entrée E.D.M. vers E-05.13	16''WC-X0053	1993	16''		DS X03-E-05.13 Rév 0
4	Sortie propane vers E-05.14A/B	36''PP-X0358	1911	36''		DS X03-E-05.13 Rév 0

	DATE	SIGNATURE
DEPARTEMENT TECHNIQUE	05/05/2014	
DEPARTEMENT PRODUCTION	10/05/14	
