LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

Brides N°	Localisation du plan de bride	N° de ligne	Spec.	Diam. de la bride	Observation
1	Sortie E.D.M.	36"WCR-X0004	1988	36"	
2	Entrée E.D.M. vers E-05.14A	36"WC-X0004	1988	36"	
3	Sortie propane vers F-05.16	1"PP-X0380	1911	1"	
4	Sortie propane vers F-05.16	1"PP-X0380	1911	1"	
5	Sortie propane vers G-07.86	18"PP-X0361	1911	18"	

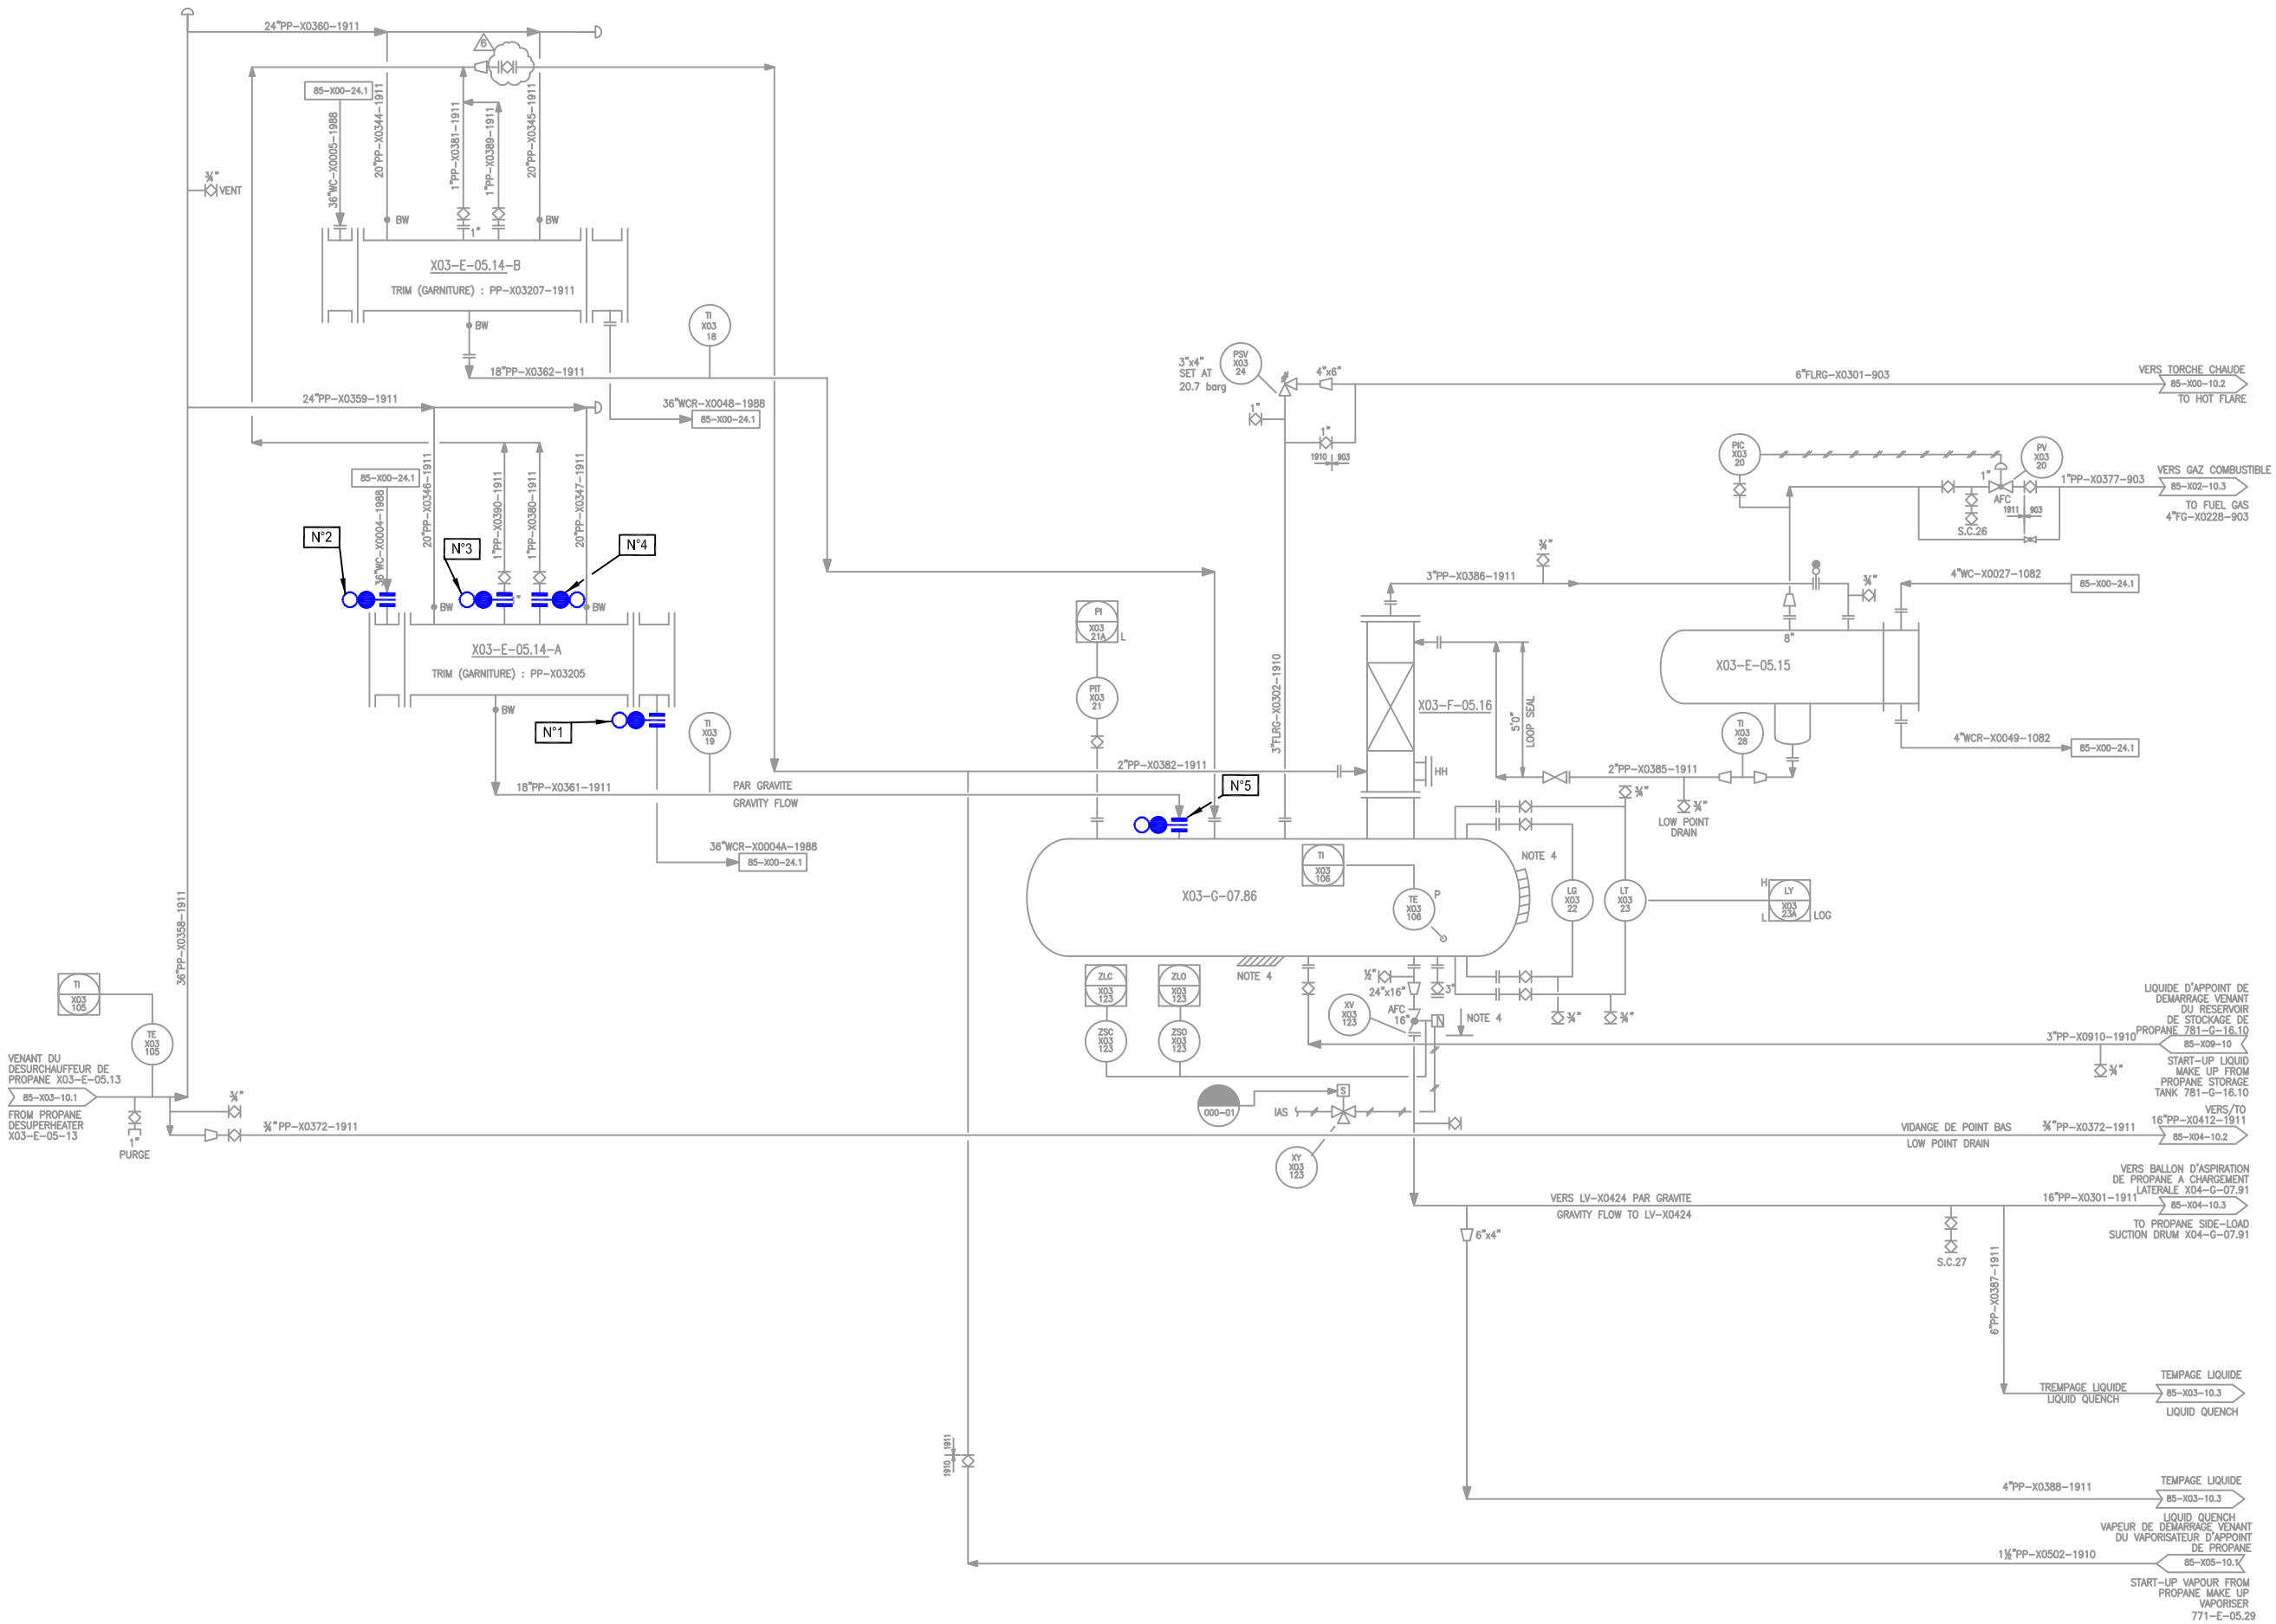

PLAN DE REFERENCE

P&ID 85-X03-10.2

REV.	DATE	REVISION	BY	CHK	OPTG SUPV	DESN ENGR	PROJ ENGR	CLIENT
0	20-10-2011	EMIS POUR INSTALLATION	B.Y			MG		

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B.BOURA — VERIFIE / CHECKED

S O N A T R A C H
ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINT PLEINS DE L'ECHANGEUR XO3-E-05.14A

JOB N°	DRAWING N°	REV.
T-1087	DS X03-E-05.14A	0

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DE L'ECHANGEUR (X03-E-05.14A) POUR TRAVAUX & INSPECTION

Bride N°	Localisation du plan de bride	N° de Ligne	Spécification des brides	Dimensions des brides	Observations	P&ID N°
1	Sortie E.D.M	36''WCR-X0004	1988	36''		85-X03-10.2
2	Entrée E.D.M. vers E-05.14A	36''WC-X0004	1988	36''		85-X03-10.2
3	Sortie propane vers F-05.16	1''PP-X0390	1911	1''		85-X03-10.2
4	Sortie propane vers F-05.16	1''PP-X0380	1911	1''		85-X03-10.2
5	Sortie propane vers G-07.86	18''PP-X0361	1911	18''		85-X03-10.2

	DATE	SIGNATURE
DEPARTEMENT TECHNIQUE	05/05/2014	
DEPARTEMENT PRODUCTION	10/05/14	
