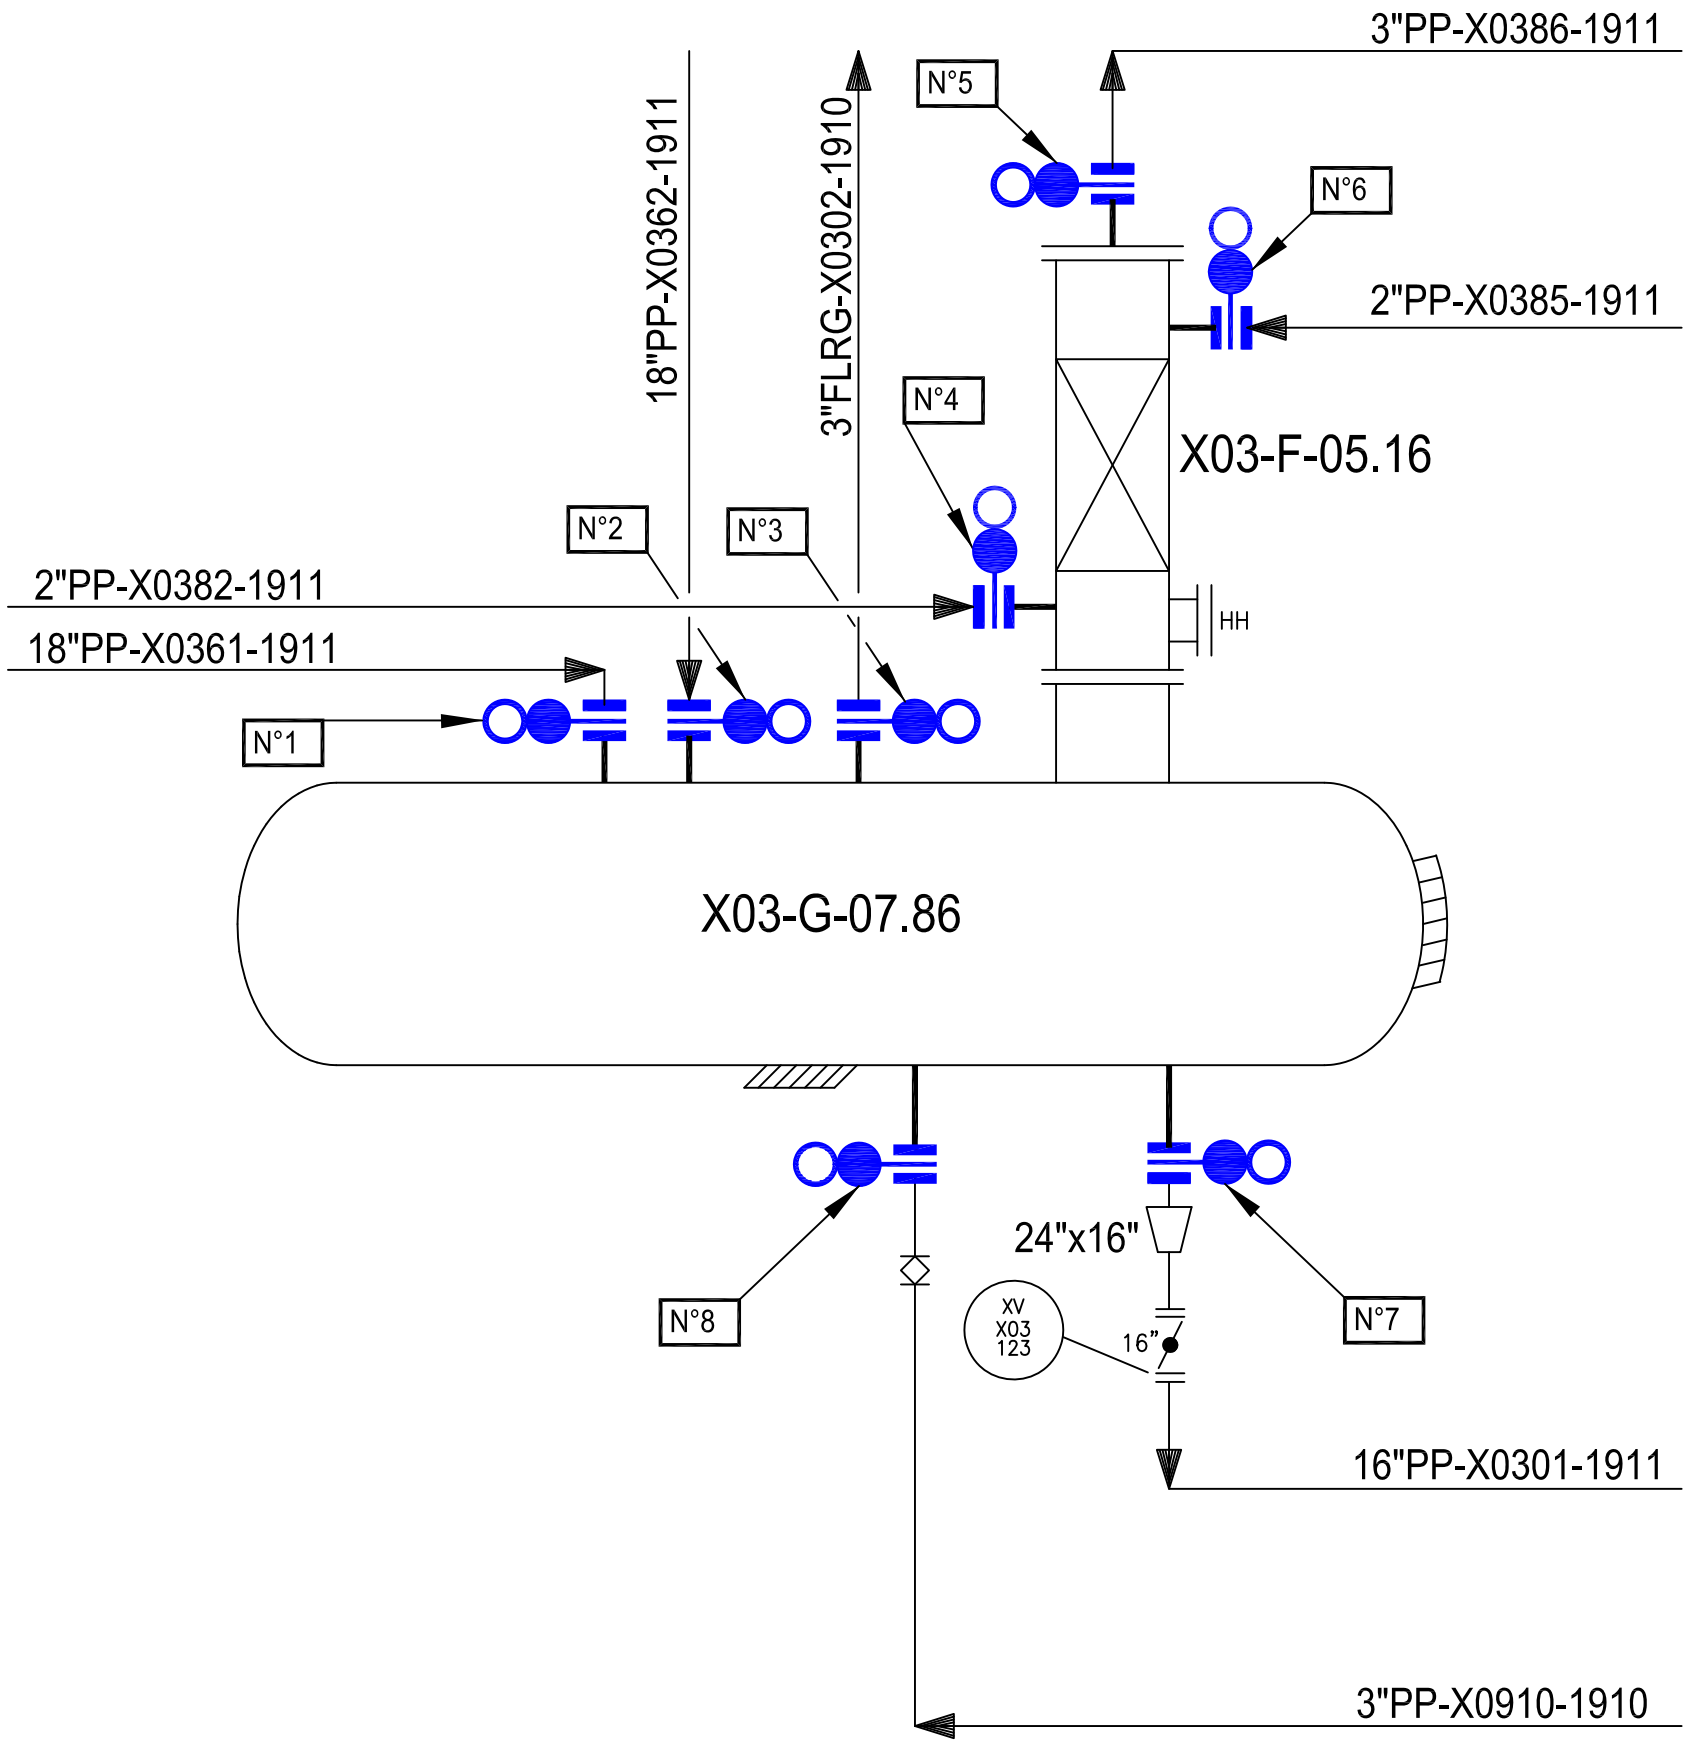

LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

Brides N°	Localisation du plan de bride	N° de ligne	Spec.	Observation
1	Alimentation E-05.14A vers G-07.86	18"PP-X0361	1911	Brider au niveau de la tubulure du ballon
2	Alimentation E-05.14B vers G-07.86	18"PP-X0362	1911	Brider au niveau de la tubulure du ballon
3	Tète G-07.86 vers torche	3"FLRG-X0302	1910	Brider au niveau de la tubulure du ballon
4	Admission F-05.16	2"PP-X0382	1911	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
5	Tete F-05.16 vers E-05.15	3"PP-X0386	1911	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
6	E-05.15 vers F-05.16	2"PP-X0385	1911	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
7	Fond G-07.86	16"PP-X0301	1911	Brider au niveau de la tubulure du ballon
8	Ligne de démarrage fond G-07.86	3"PP-X0910	1910	Brider au niveau de la tubulure du ballon

PLAN DE REFERENCE

P&ID 85-X03-10.2

REV.	DATE	REVISION	BY	CHK	DFTG SUPV	DES'N ENG'R	PROJ ENG'R	CLIENT
1	02-11 2011	MISE A JOUR	B.Y					
0	26-06 2004	EMIS POUR INSTALLATION	BB					

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B.YETTOU — VERIFIE / CHECKED: M.DINEDANE

S O N A T R A C H

ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

ISOLEMENT PAR SPECTACLE BLIND
POUR PENETRATION
DU X03-G-07.86

JOB N°	DRAWING N°	REV.
T-1087	DS X03-G-07.86	1

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DE L'ACCUMULATEUR (X03-G-07.86) POUR TRAVAUX & INSPECTION

Bride N°	Localisation du plan de bride	N° de Ligne	Spécifications des brides	Dimensions des brides	Observations	P&ID N°
1	Alimentation E-514A vers G-786	18"PP-X0361	1911	18"		85-X03-10.2
2	Alimentation E-514B vers G-786	18"PP-X0362	1911	18"		85-X03-10.2
3	Tête G-786 vers torche	3"FLRG-X0302	1910	3"		85-X03-10.2
4	Admission F-516	2"PP-X0382	1911	2"		85-X03-10.2
5	Tête F-516 vers E-515	3"PP-X0386	1911	3"		85-X03-10.2
6	E-515 vers F-516	2"PP-X0385	1911	2"		85-X03-10.2
7	Fond G-786	16"PP-X0301	1911	24"		85-X03-10.2
8	Ligne de démarrage fond G-786	3"PP-X0910	1910	3"		85-X03-10.2

	DATE	SIGNATURE
DEPARTEMENT TECHNIQUE	11/05/2014	
DEPARTEMENT PRODUCTION	11/05/14	
