LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

Brides N°	Localisation du plan de bride	N° de ligne	Spec.	Diam. de la bride	Observation
1	Ligne de gaz venant du F-07.11 vers E-05.23	24"PRG-X0425	1937	24"	
2	Entrée propane vers E-05.23	6"PP-X0420	1912	3"	
3	Ligne de gaz vers E-05.40	18"PRG-X04206	1937	18"	

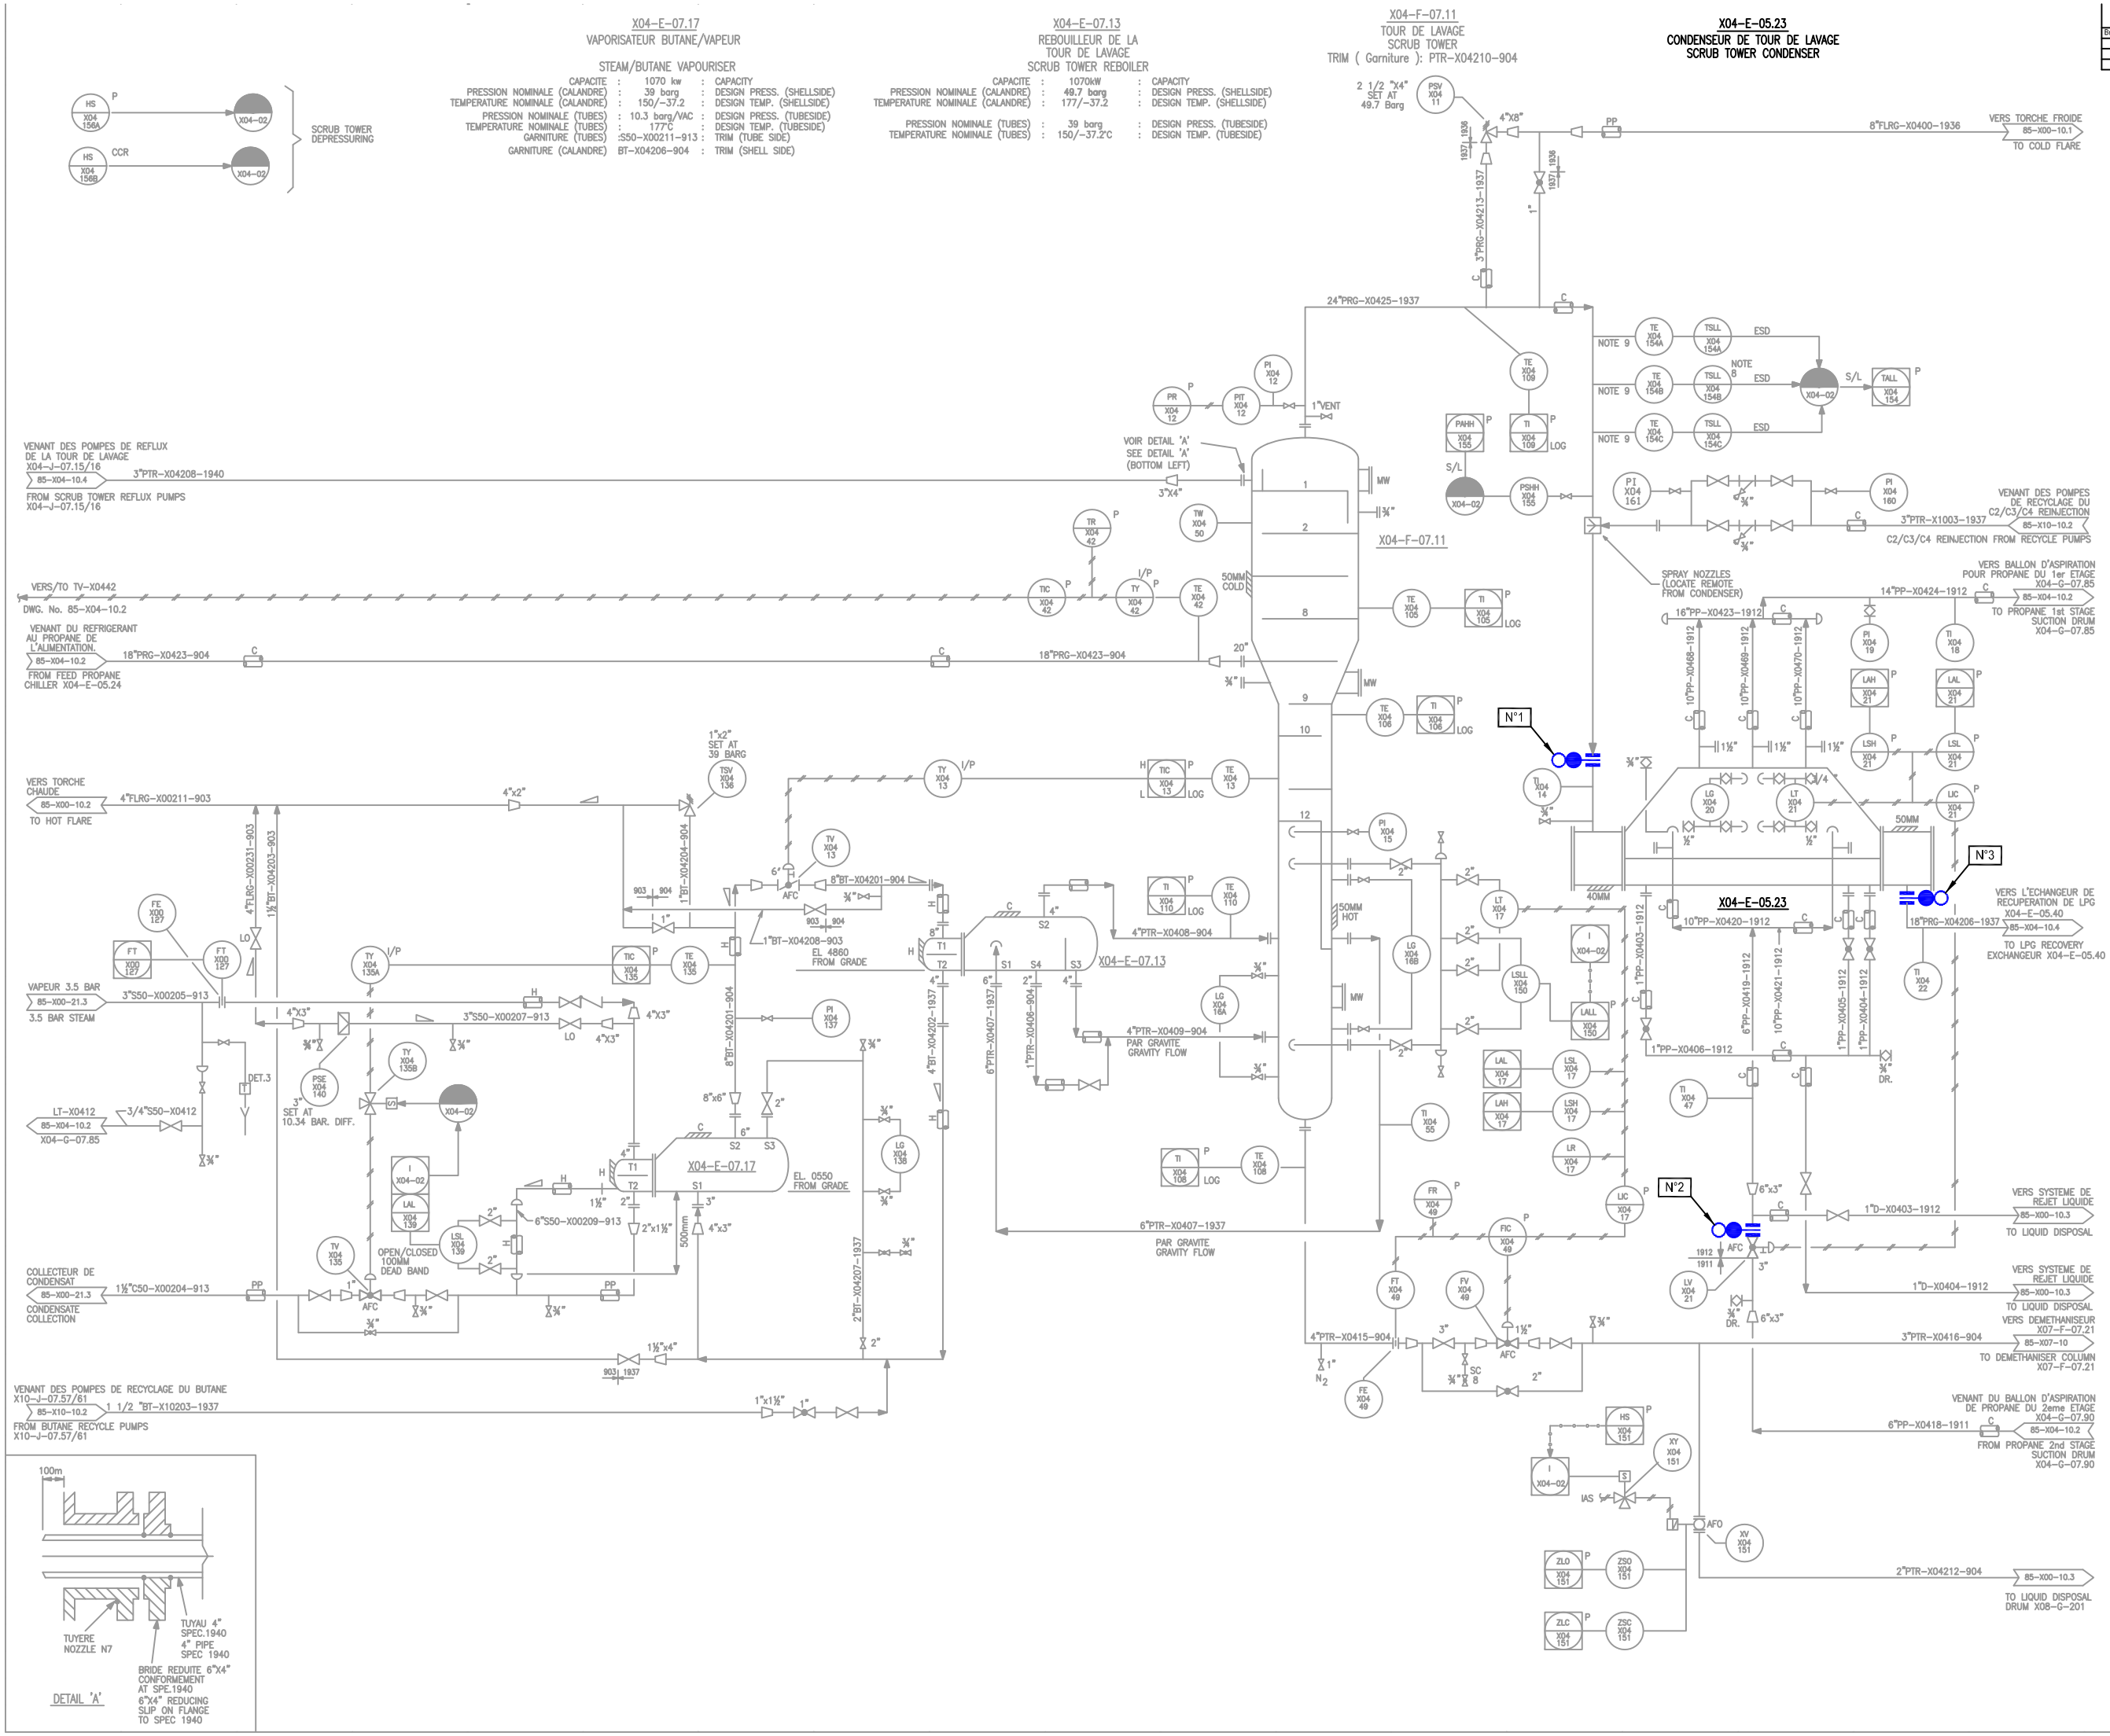

PLAN DE REFERENCE

P&ID 85-X04-10.1

REV.	DATE	REVISION	BY	CHK	OPTG SUPV	DESN ENGR	PROJ ENGR	CLIENT
0	25-05-2004	EMIS POUR INSTALLATION	BB					

ECHELLE / SCALE : NONE — ETABLI / DRAWN : B.BOURA — VERIFIE / CHECKED :

S O N A T R A C H
ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINT PLEINS DE L'ECHANGEUR XO4-E-05.23

JOB N°	DRAWING N°	REV.
T-1087	DS X04-E-05.23	0

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DE L'ECHANGEUR (X04-E-05.23) POUR TRAVAUX & INSPECTION

Bride N°	Localisation du plan de bride	N° de Ligne	Spécification des brides	Dimensions des brides	Observations	P&ID N°
1	Ligne de gaz venant F-07.1 vers E-05.23	24"PRG-X0425	1937	24"		85-X04-10.2
2	Entrée propane vers E-05.23	6"PP-X0419	1912	3"		85-X04-10.2
3	Ligne de gaz vers E-05.40	18"PRG-X04206	1937	18"		85-X04-10.2
4	Ligne de drain de l'échangeur E-523	1" PP-X0404	1912	1"		85-X04-10.2
5	Ligne de drain de l'échangeur E-523	1" PP-X0405	1912	1"		85-X04-10.2
6	Ligne de drain de l'échangeur E-523	1" PP-X0403	1912	1"		85-X04-10.2

	DATE	SIGNATURE
DEPARTEMENT TECHNIQUE	13/05/2014	
DEPARTEMENT PRODUCTION	14.05.14	
