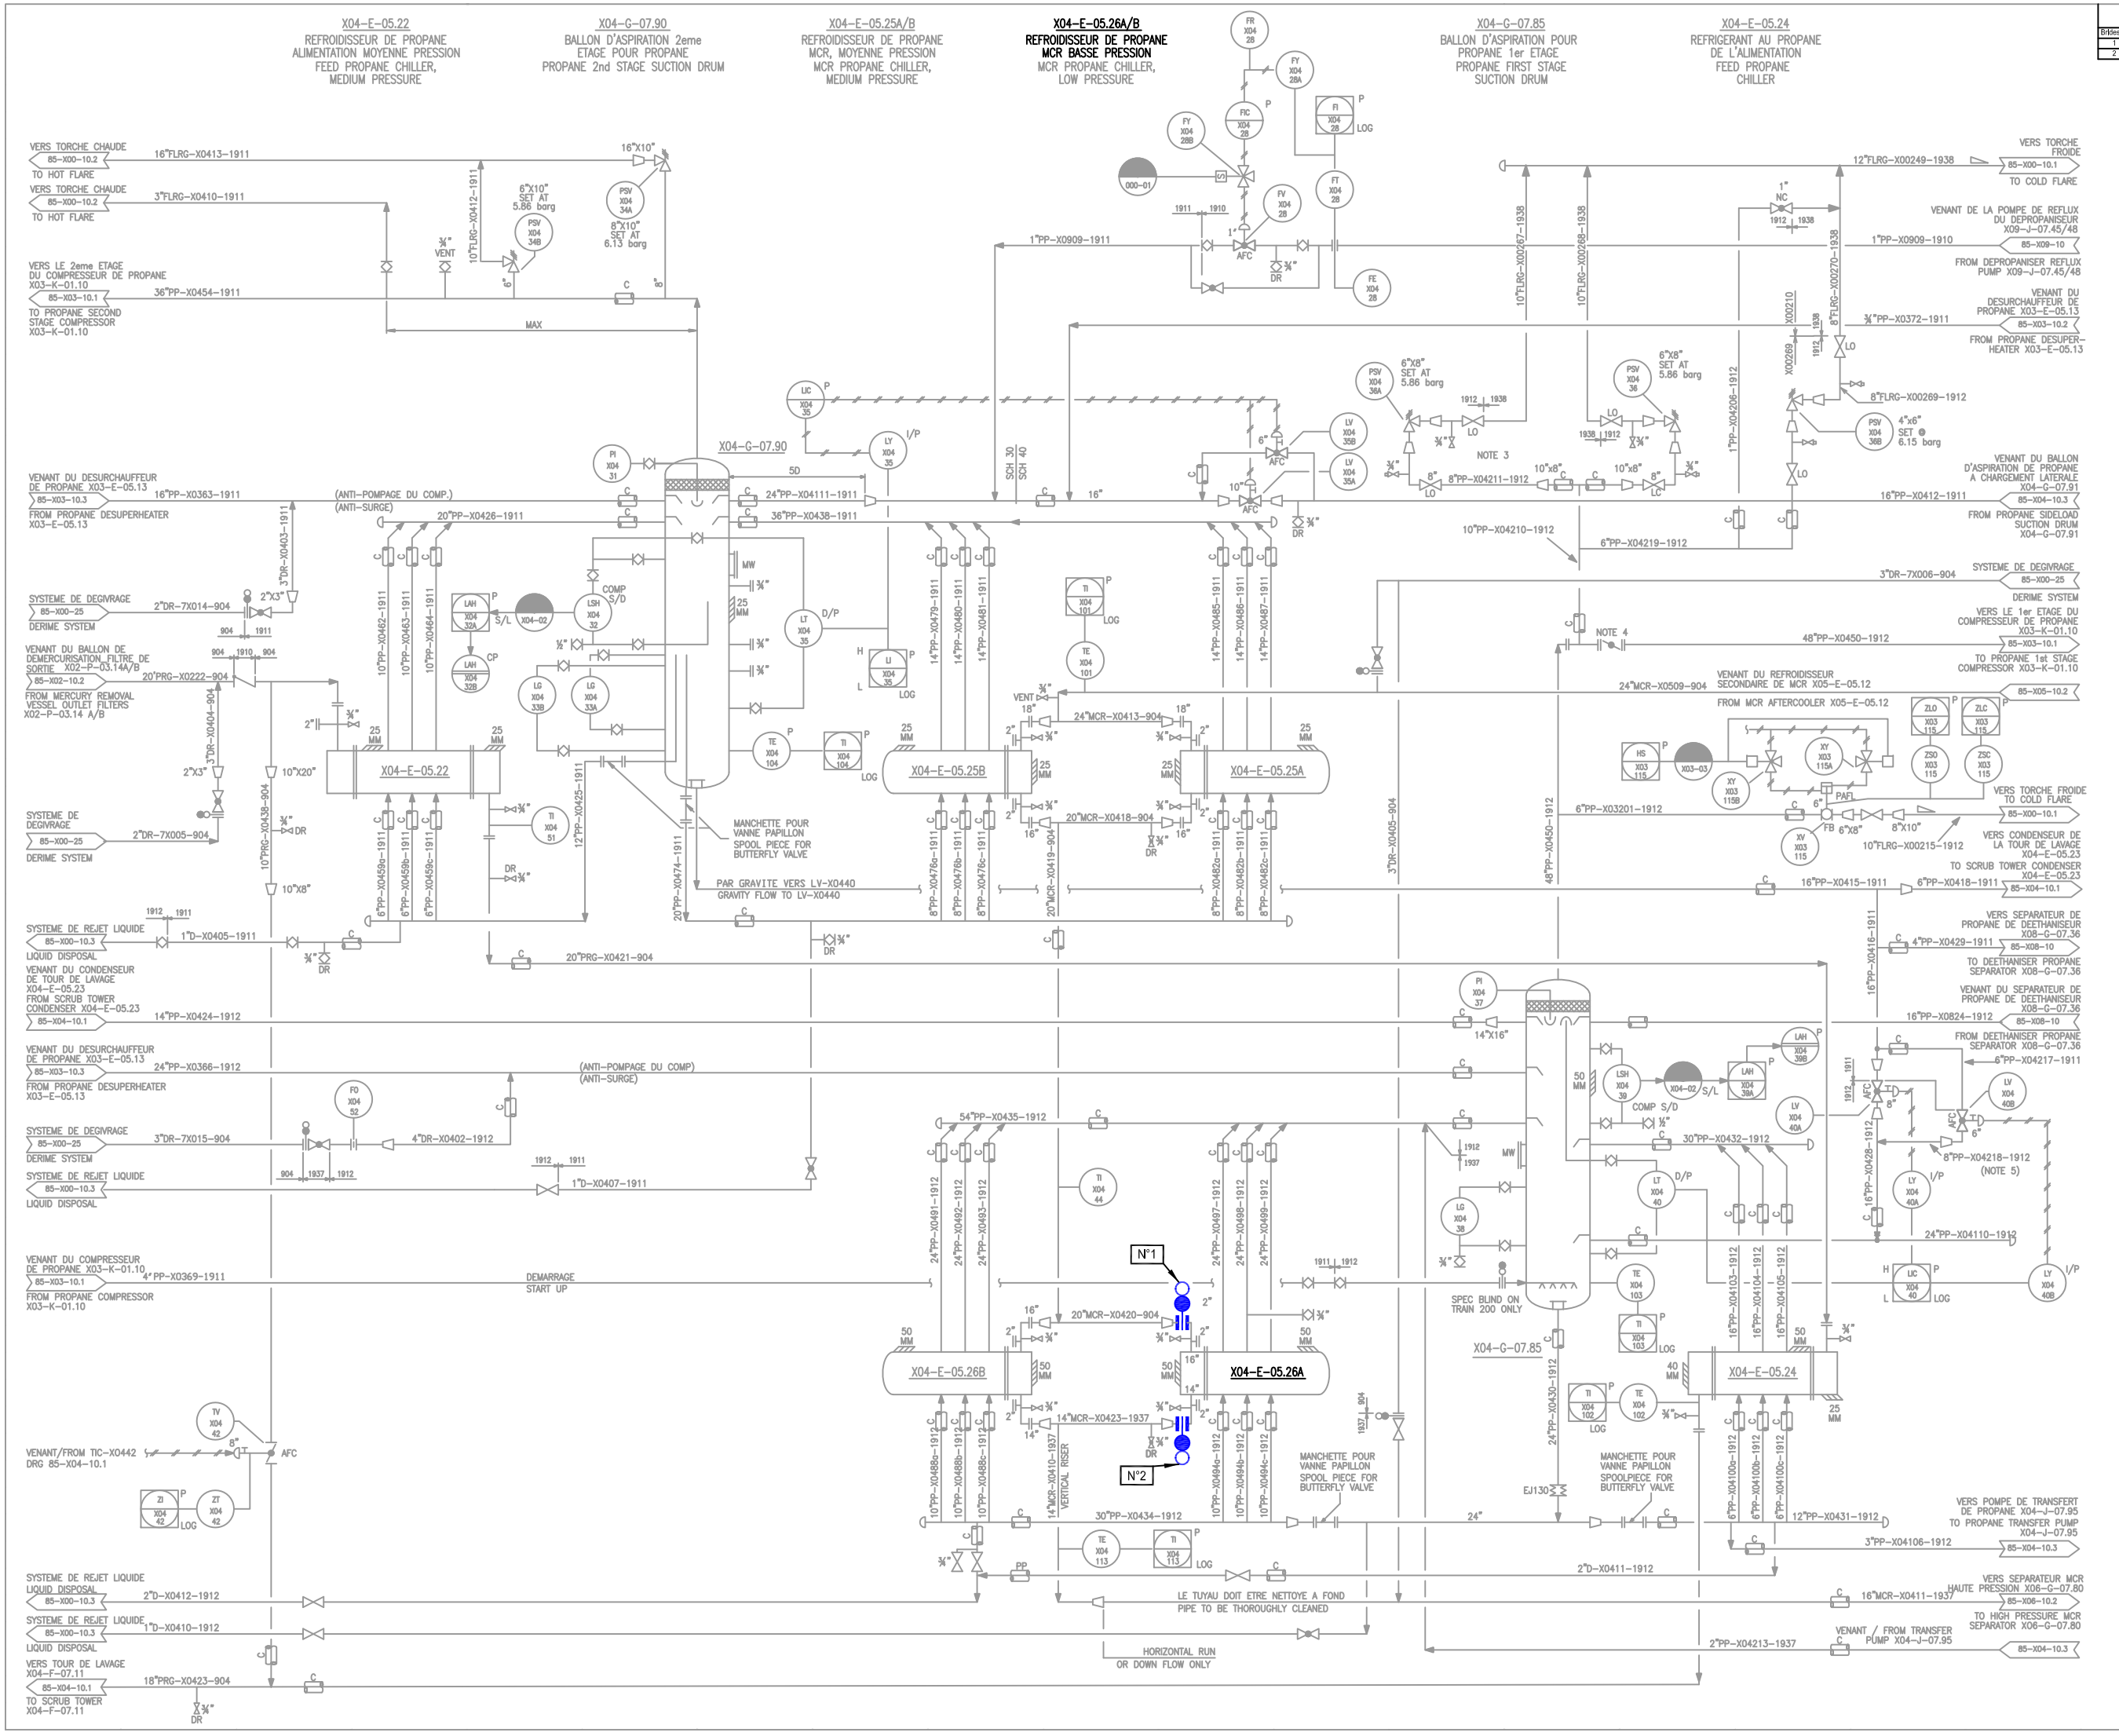

LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

Brides N°	Localisation du plan de bride	N° de ligne	Spec.	Diam. de la bride	Observation
1	Entrée MCR vers E-05.26A/B	20"MCR-X0420	904	16"	
2	Sortie MCR vers G-07.80	14"MCR-X0418	1937	14"	

PLAN DE REFERENCE

P&ID 85-X04-10.2

REV.	DATE	REVISION	BY	CHK	GPTG	DESN ENGR	PROJ ENGR	CLIENT
0	25-05-2005	EMIS POUR INSTALLATION	BB					

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B.BOURA — VERIFIE / CHECKED:

S O N A T R A C H
ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINT PLEINS DE L'ECHANGEUR XO4-E-05.26A

JOB N°	DRAWING N°	REV.
T-1087	DS X04-E-05.26A	0

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DE L'ECHANGEUR (X04-E-05.26A) POUR TRAVAUX & INSPECTION

Bride N°	Localisation du plan de bride	N° de Ligne	Spécification des brides	Dimensions des brides	Observations	P&ID N°
1	Entrée MCR vers E-05.26A/B	20''MCR-X0420	904	16''		85-X04-10.2
2	Sortie MCR vers G-07.80	14''MCR-X0423	1937	14''		85-X04-10.2

	DATE	SIGNATURE
DEPARTEMENT TECHNIQUE	05/05/2014	
DEPARTEMENT PRODUCTION	12/05/14	
