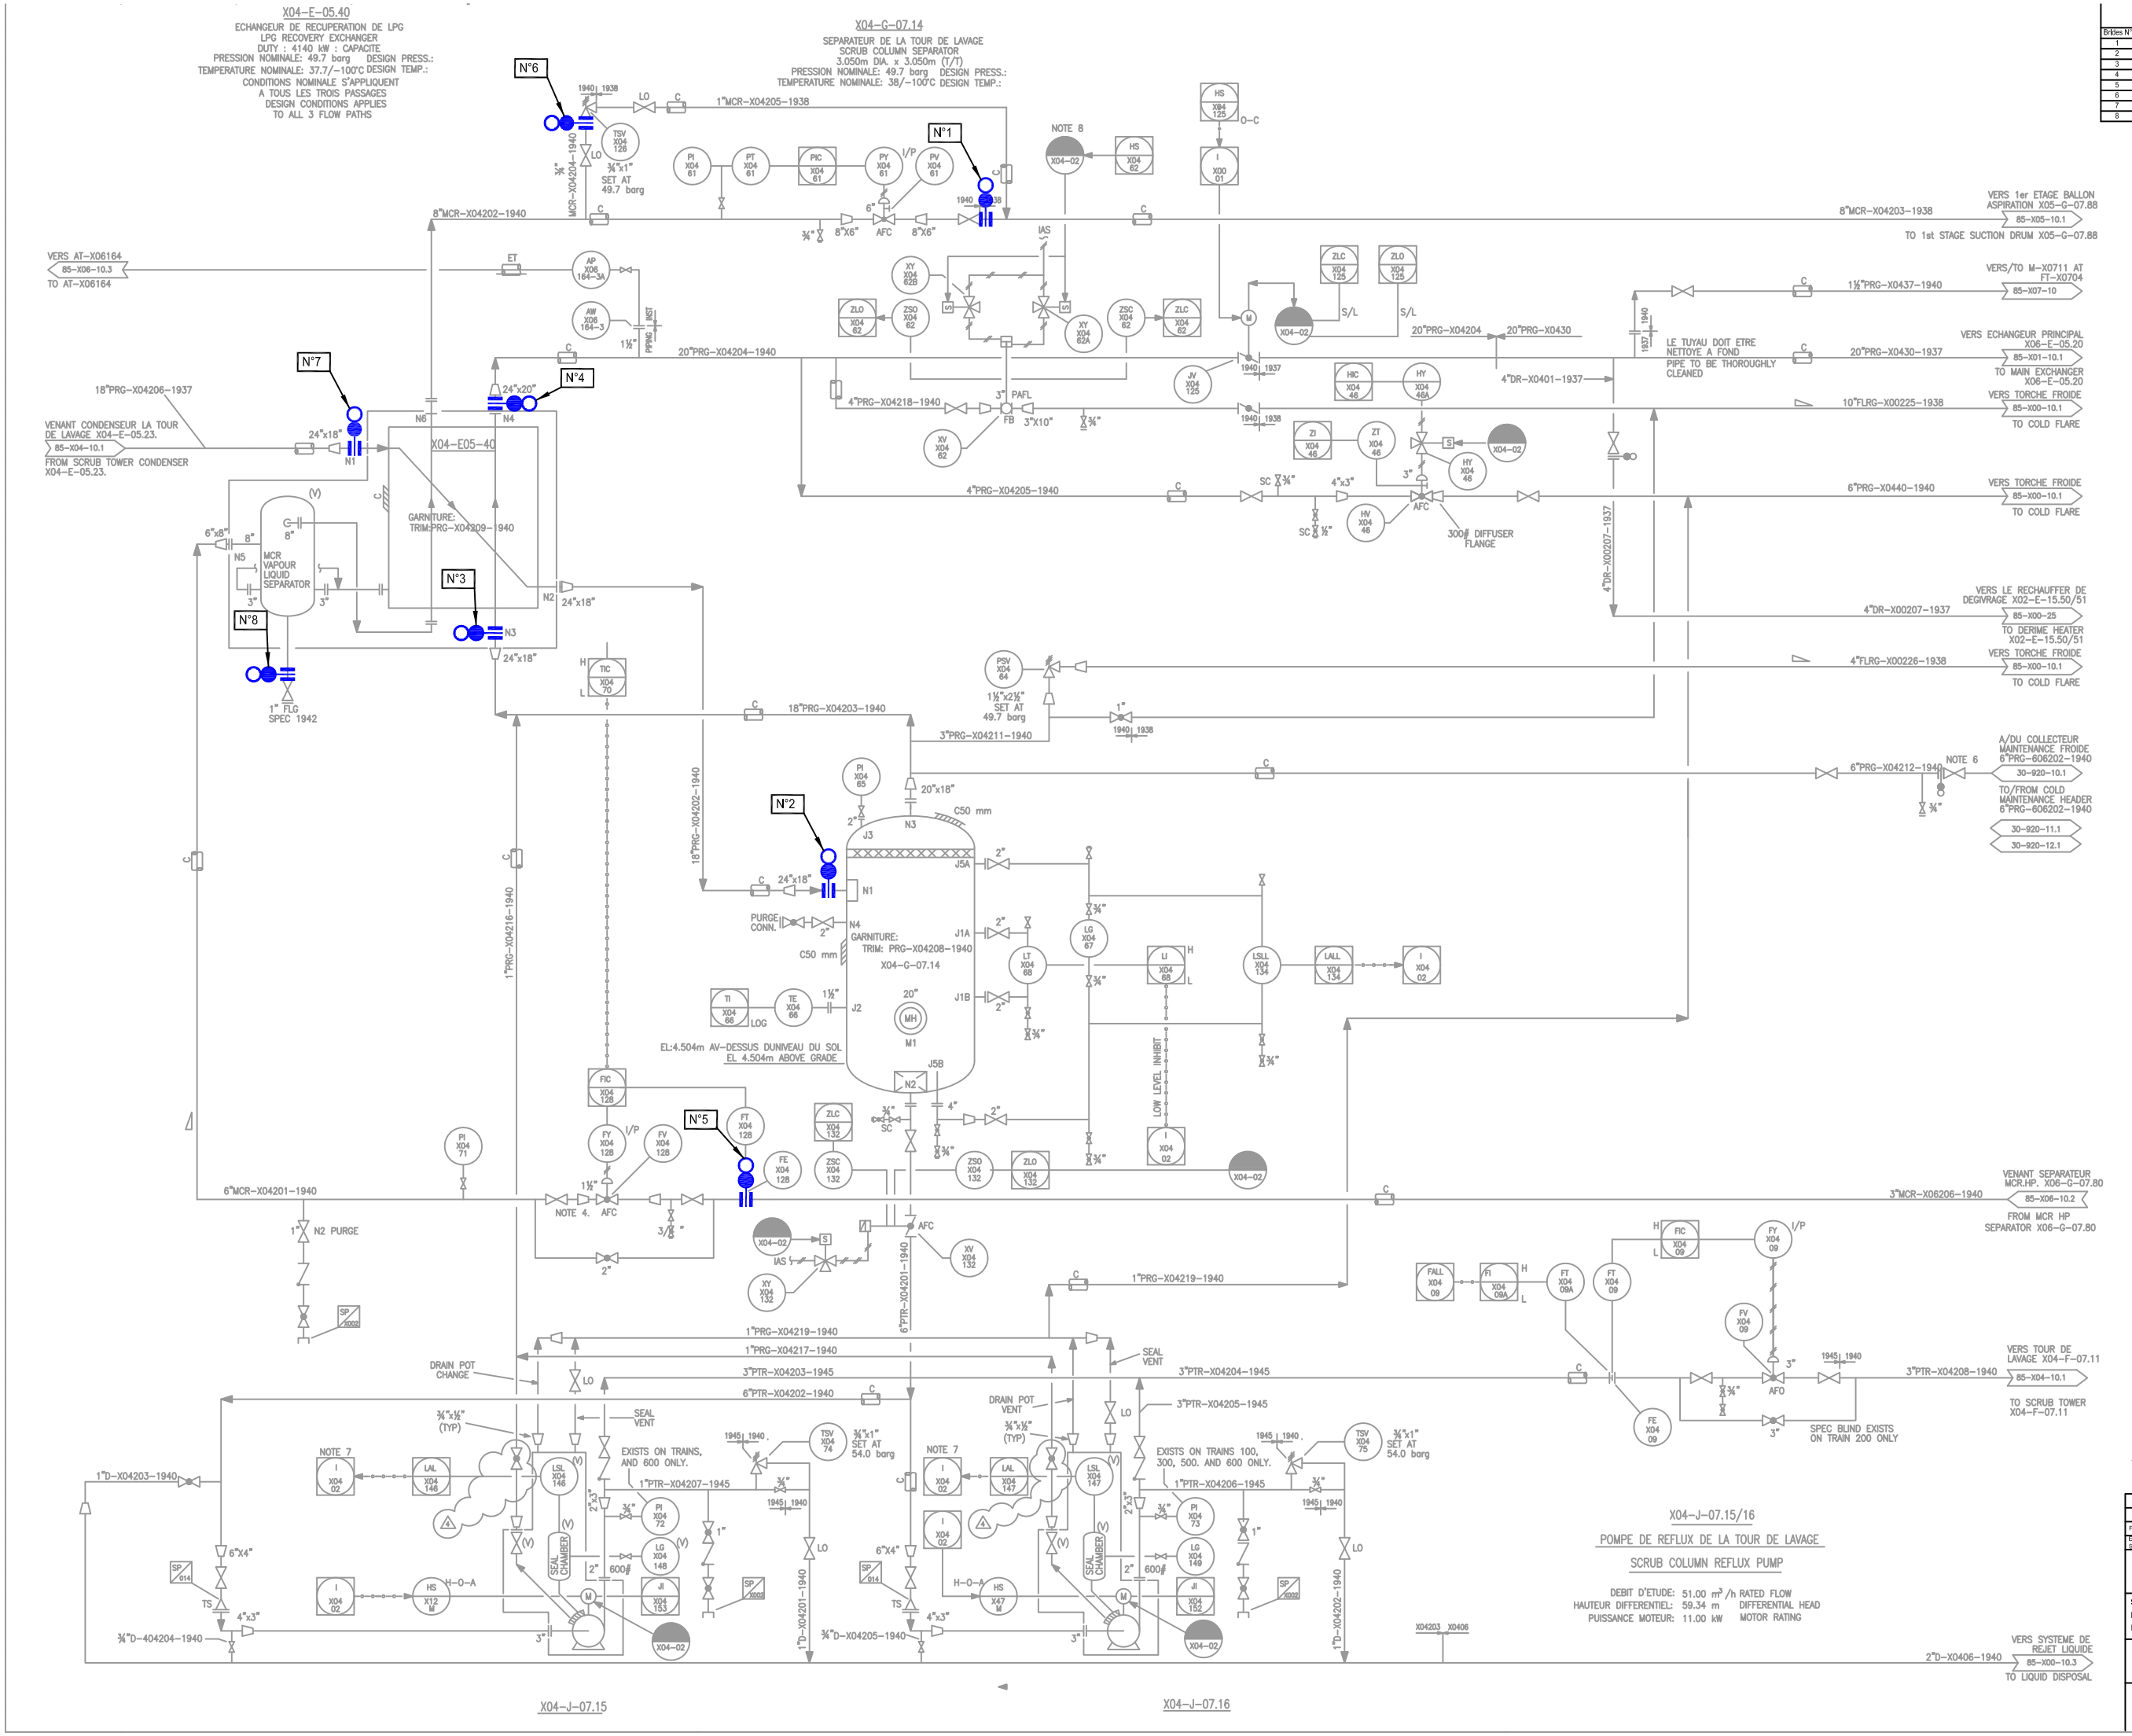


## LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

| Brides N° | Localisation du plan de bride | N° de ligne | Spec. | Diam. de la bride | Observation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sortie MCR du E-05.40 et aval PV-X0441 | 8"MCR-X04203 | 1938 | 8" | |
| 2 | GNT et HC,liquide sortie E-540 vers G-714 | 18"PRG-X04202 | 1940 | 24" | |
| 3 | GNT tête G-714 vers E-540 | 18"PRG-X04203 | 1940 | 24" | |
| 4 | Sortie E-540 vers E-520 | 20"PRG-X04204 | 1940 | 24" | |
| 5 | Sortie G-780 vers E-540 | 3"MCR-X06206 | 1940 | 3" | |
| 6 | TSV- X04126 | 3/4"MCR-X04204 | 1940 | 3/4" | |
| 7 | GNT de tête F-711 vers E-540 | 18"PRG-X04206 | 1937 | 24" | |
| 8 | Drain Ballon Interieur E-0540 | 1" | 1942 | 1" | |

## PLAN DE REFERENCE

P&ID 85-X04-10.4

| REV. | DATE | REVISION | BY | CHK | OPTG OPY | DESN ENGR | PROJ MGR | CLIENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-06-2006 | EMIS POUR INSTALLATION DES BRIDES POURITES? | BB | | | SB | | |
| 0 | 19-03-2006 | EMIS POUR INSTALLATION | BB | | | | | |

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B.BOUIRA — VERIFIE / CHECKED:

**S O N A T R A C H**
ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

**PROCEDURE DE MISE SOUS JOINT PLEINS DE L'ECHANGEUR X04-E-05.40**

| JOB N° | DRAWING N° | REV. |
|---|---|---|
| T-1087 | DS X04-E-05.40 | 1 |

# PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DE L'ECHANGEUR (X04-E-05.40) POUR TRAVAUX & INSPECTION

| Bride N° | Localisation du plan de bride | N° de Ligne | Spécification des brides | Dimensions des Brides | Observations | P&ID N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SORTIE MCR DU E-05.40 EN AVAL PV-X04-61 | 8''MCR-X04202 | 1940 | 6'' | | 85-X04-10.4 |
| 2 | GNT et HC. Lourds sortie E-540 Vers G-07.14 | 18"PRG-X04202 | 1940 | 24'' | | 85-X04-10.4 |
| 3 | GNT tête G-07.14 vers E-540 | 18''PRG-X04203 | 1940 | 24'' | | 85-X04-10.4 |
| 4 | Sortie E-05.40 vers E-05.20 | 20''PRG-X04204 | 1940 | 24'' | | 85-X04-10.4 |
| 5 | Alimentation MCR vers E-05.40 | 3''MCR-X06206 | 1940 | 3'' | | 85-X04-10.4 |
| 6 | TSV- X04-126 | 3/4'' MCR-X04204 | 1940 | 3/4'' | | 85-X04-10.4 |
| 7 | GNT de la tête F-711 vers E-540 | 18''PRG-X04206 | 1937 | 24'' | | 85-X04-10.4 |
| 8 | DRAIN BALLON INTER. E-05.40 | 1'' | 1940 | 1'' | | 85-X04-10.4 |

| | DATE | SIGNATURE |
|---|---|---|
| DEPARTEMENT TECHNIQUE | 11/05/2014 | |
| DEPARTEMENT PRODUCTION | 12/05/14 | |
