LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

Brides N°	Localisation du plan de bride	N° de ligne	Spec.	Observation
1	Tête F-711	24"PRG-X0425	1937	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
2	Fond F-711 vers E-713	6"PTR-X0407	1937	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
3	Fond F-711 vers F-721	4"PTR-X0415	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
4	Liquide E-713 vers F-711	4"PTR-X0409	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
5	Vapeur E-713 vers F-711	4"PTR-X0408	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
6	Alimentation F-711	18"PRG-X0423	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
7	Reflux vers F-711	3"PTR-X04208	1940	Brider au niveau de la tubulure de la colonne

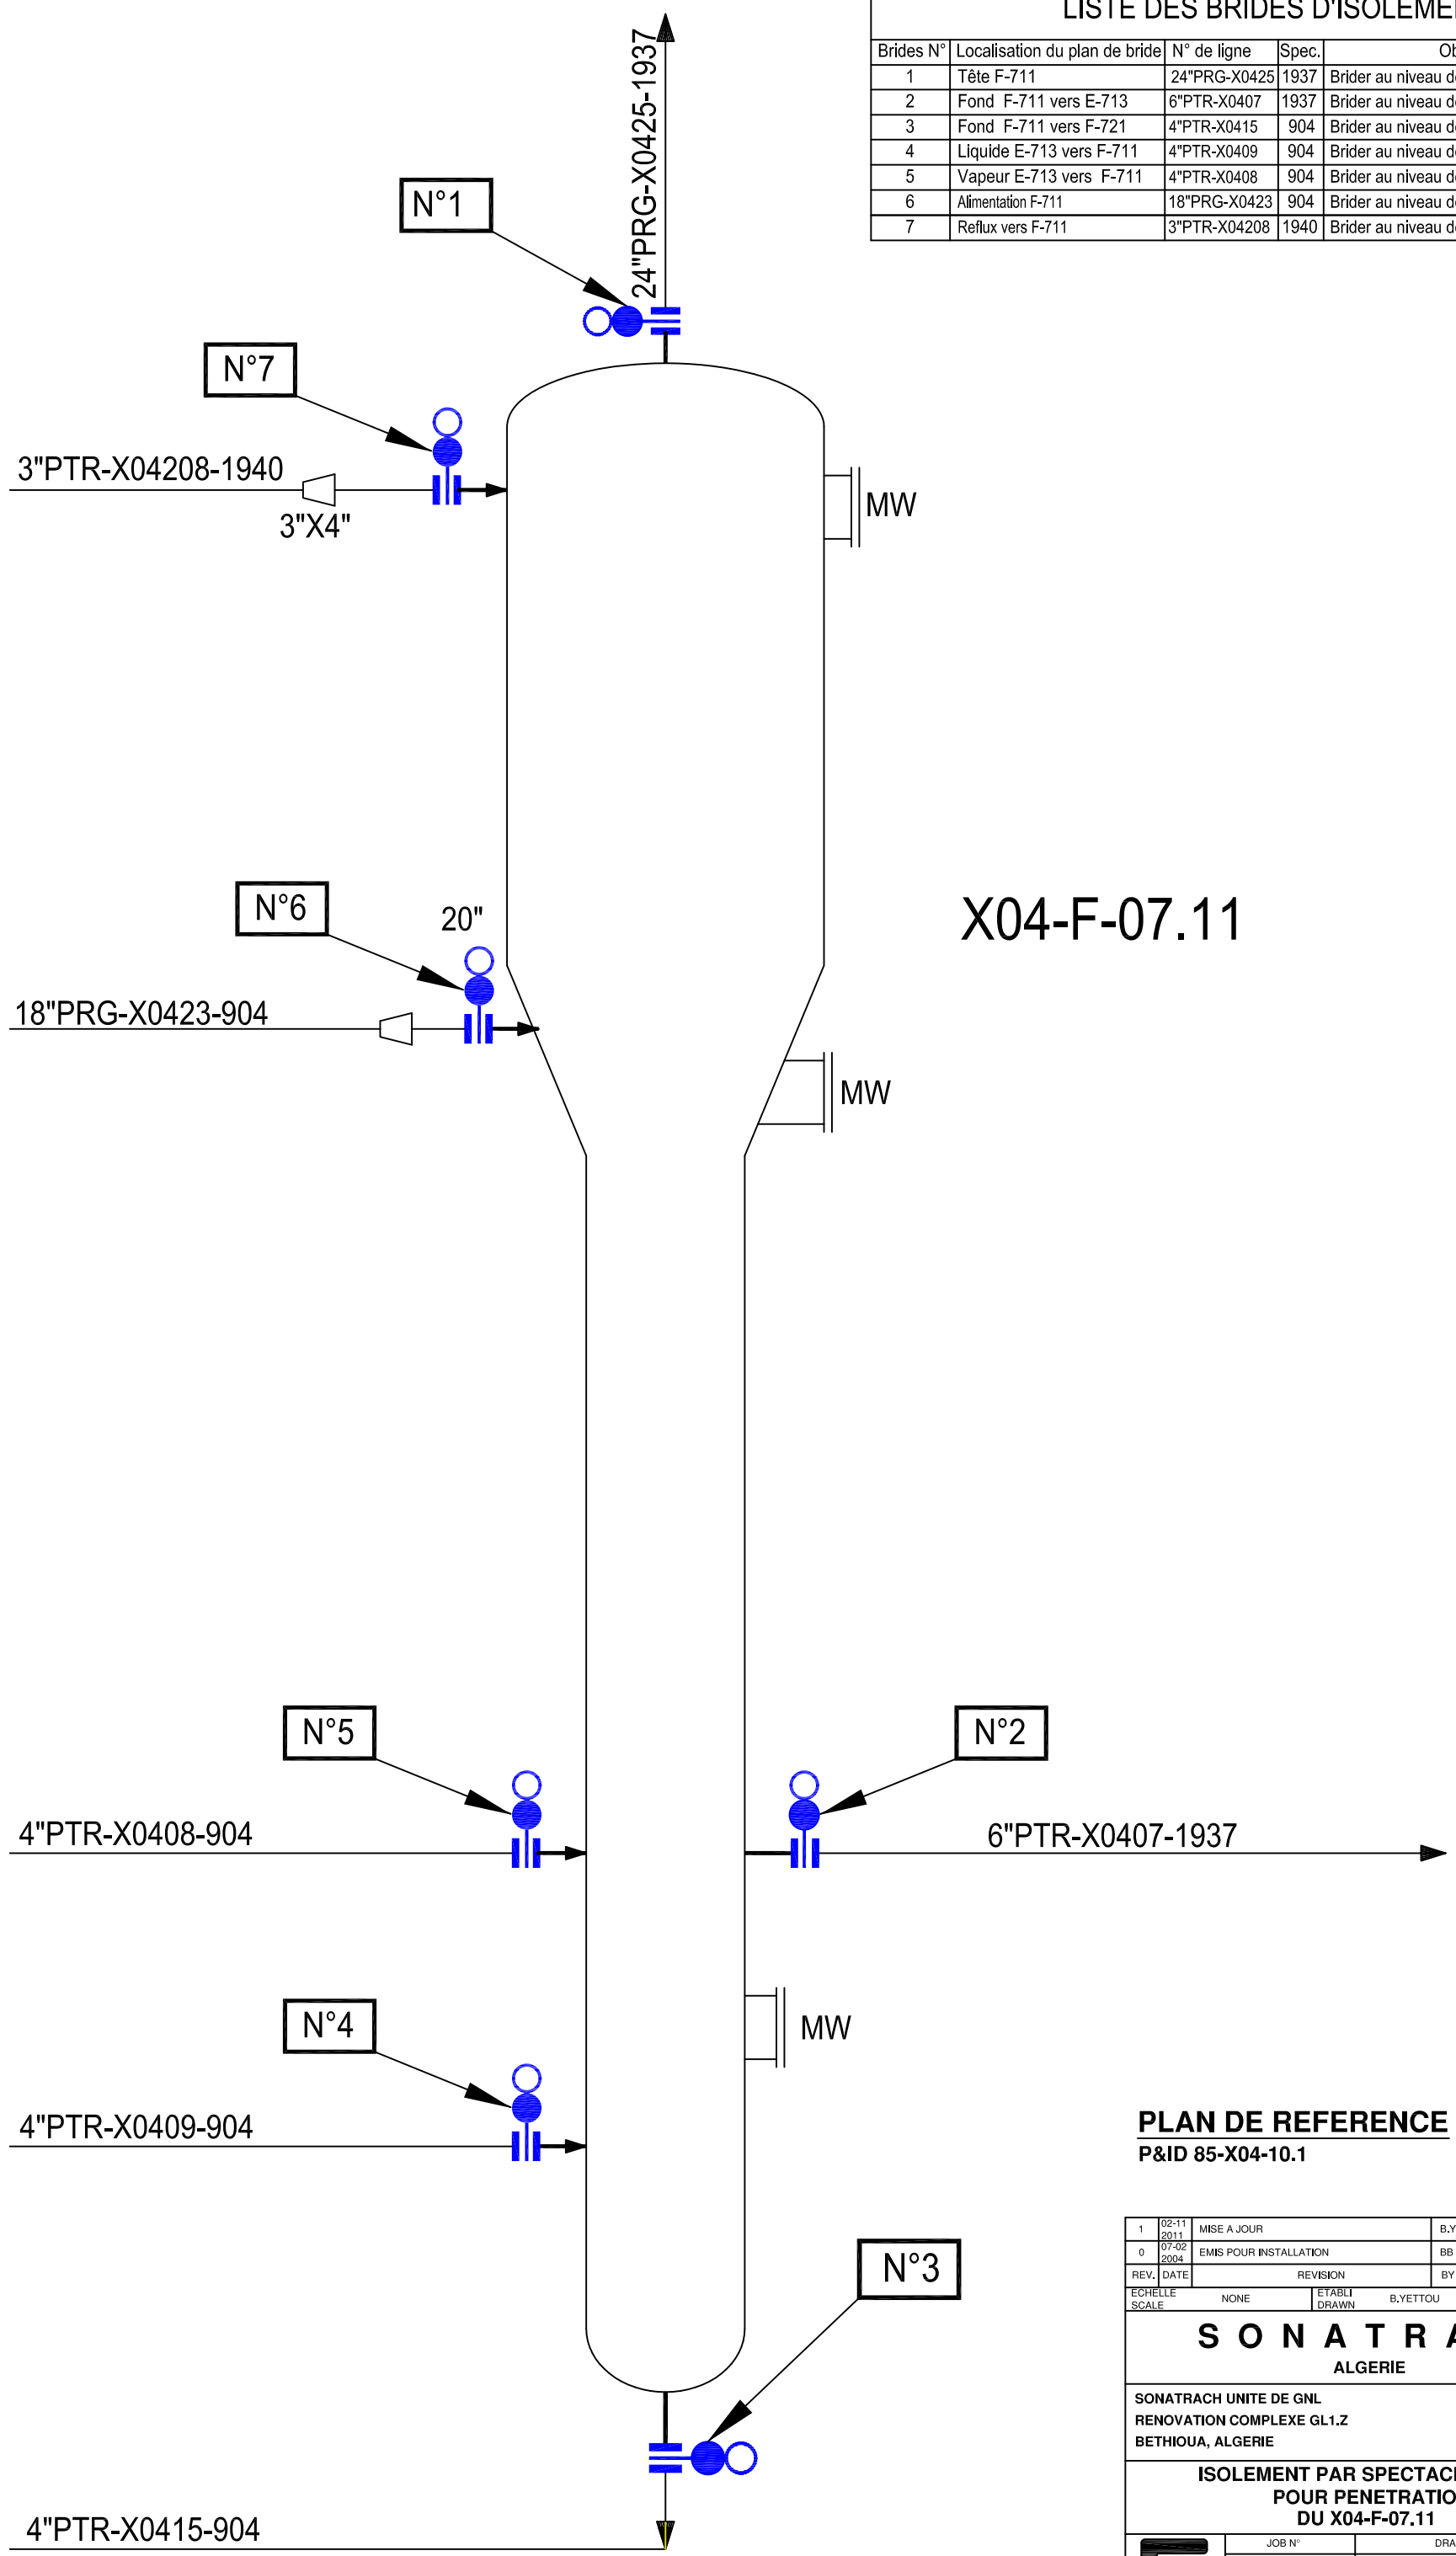

PLAN DE REFERENCE
P&ID 85-X04-10.1

REV.	DATE	REVISION	BY	CH'K	DFTG SUPV	DES'N ENG'R	PROJ ENG'R	CLIENT
1	02-11 2011	MISE A JOUR	B.Y			MD		
0	07-02 2004	EMIS POUR INSTALLATION	BB					

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B.YETTOU — VERIFIE / CHECKED: M.DINEDANE

S O N A T R A C H
ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

ISOLEMENT PAR SPECTACLE BLIND POUR PENETRATION DU X04-F-07.11

JOB N°	DRAWING N°	REV.
T-1087	DS X04-F-07.11	1

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DE LA COLONNE (X04-F-07.11) POUR TRAVAUX & INSPECTION

Bride N°	Localisation du plan de bride	N° de Ligne	Spécification des brides	Dimensions des brides	Observations	P&ID N°
1	Tête F-711	24"PRG-X0425	1937	24"		85-X04-10.1
2	Fond F-711 vers E-717	6"PTR-X0407	1937	6"		85-X04-10.1
3	Fond F-711 vers F-721	4"PTR-X0415	904	4"		85-X04-10.1
4	Liquide E-713 vers F-711	4"PTR-X0409	904	4"		85-X04-10.1
5	Vapeur E-713 vers F-711	4"PTR-X0408	904	4"		85-X04-10.1
6	Alimentation F-711	18"PRG-X0423	904	20"		85-X04-10.1
7	Reflux vers F-711	3"PTR-X04208	1940	4"		85-X04-10.1

	DATE	SIGNATURE
DEPARTEMENT TECHNIQUE	05/05/2014	
DEPARTEMENT PRODUCTION	11/05/14	
