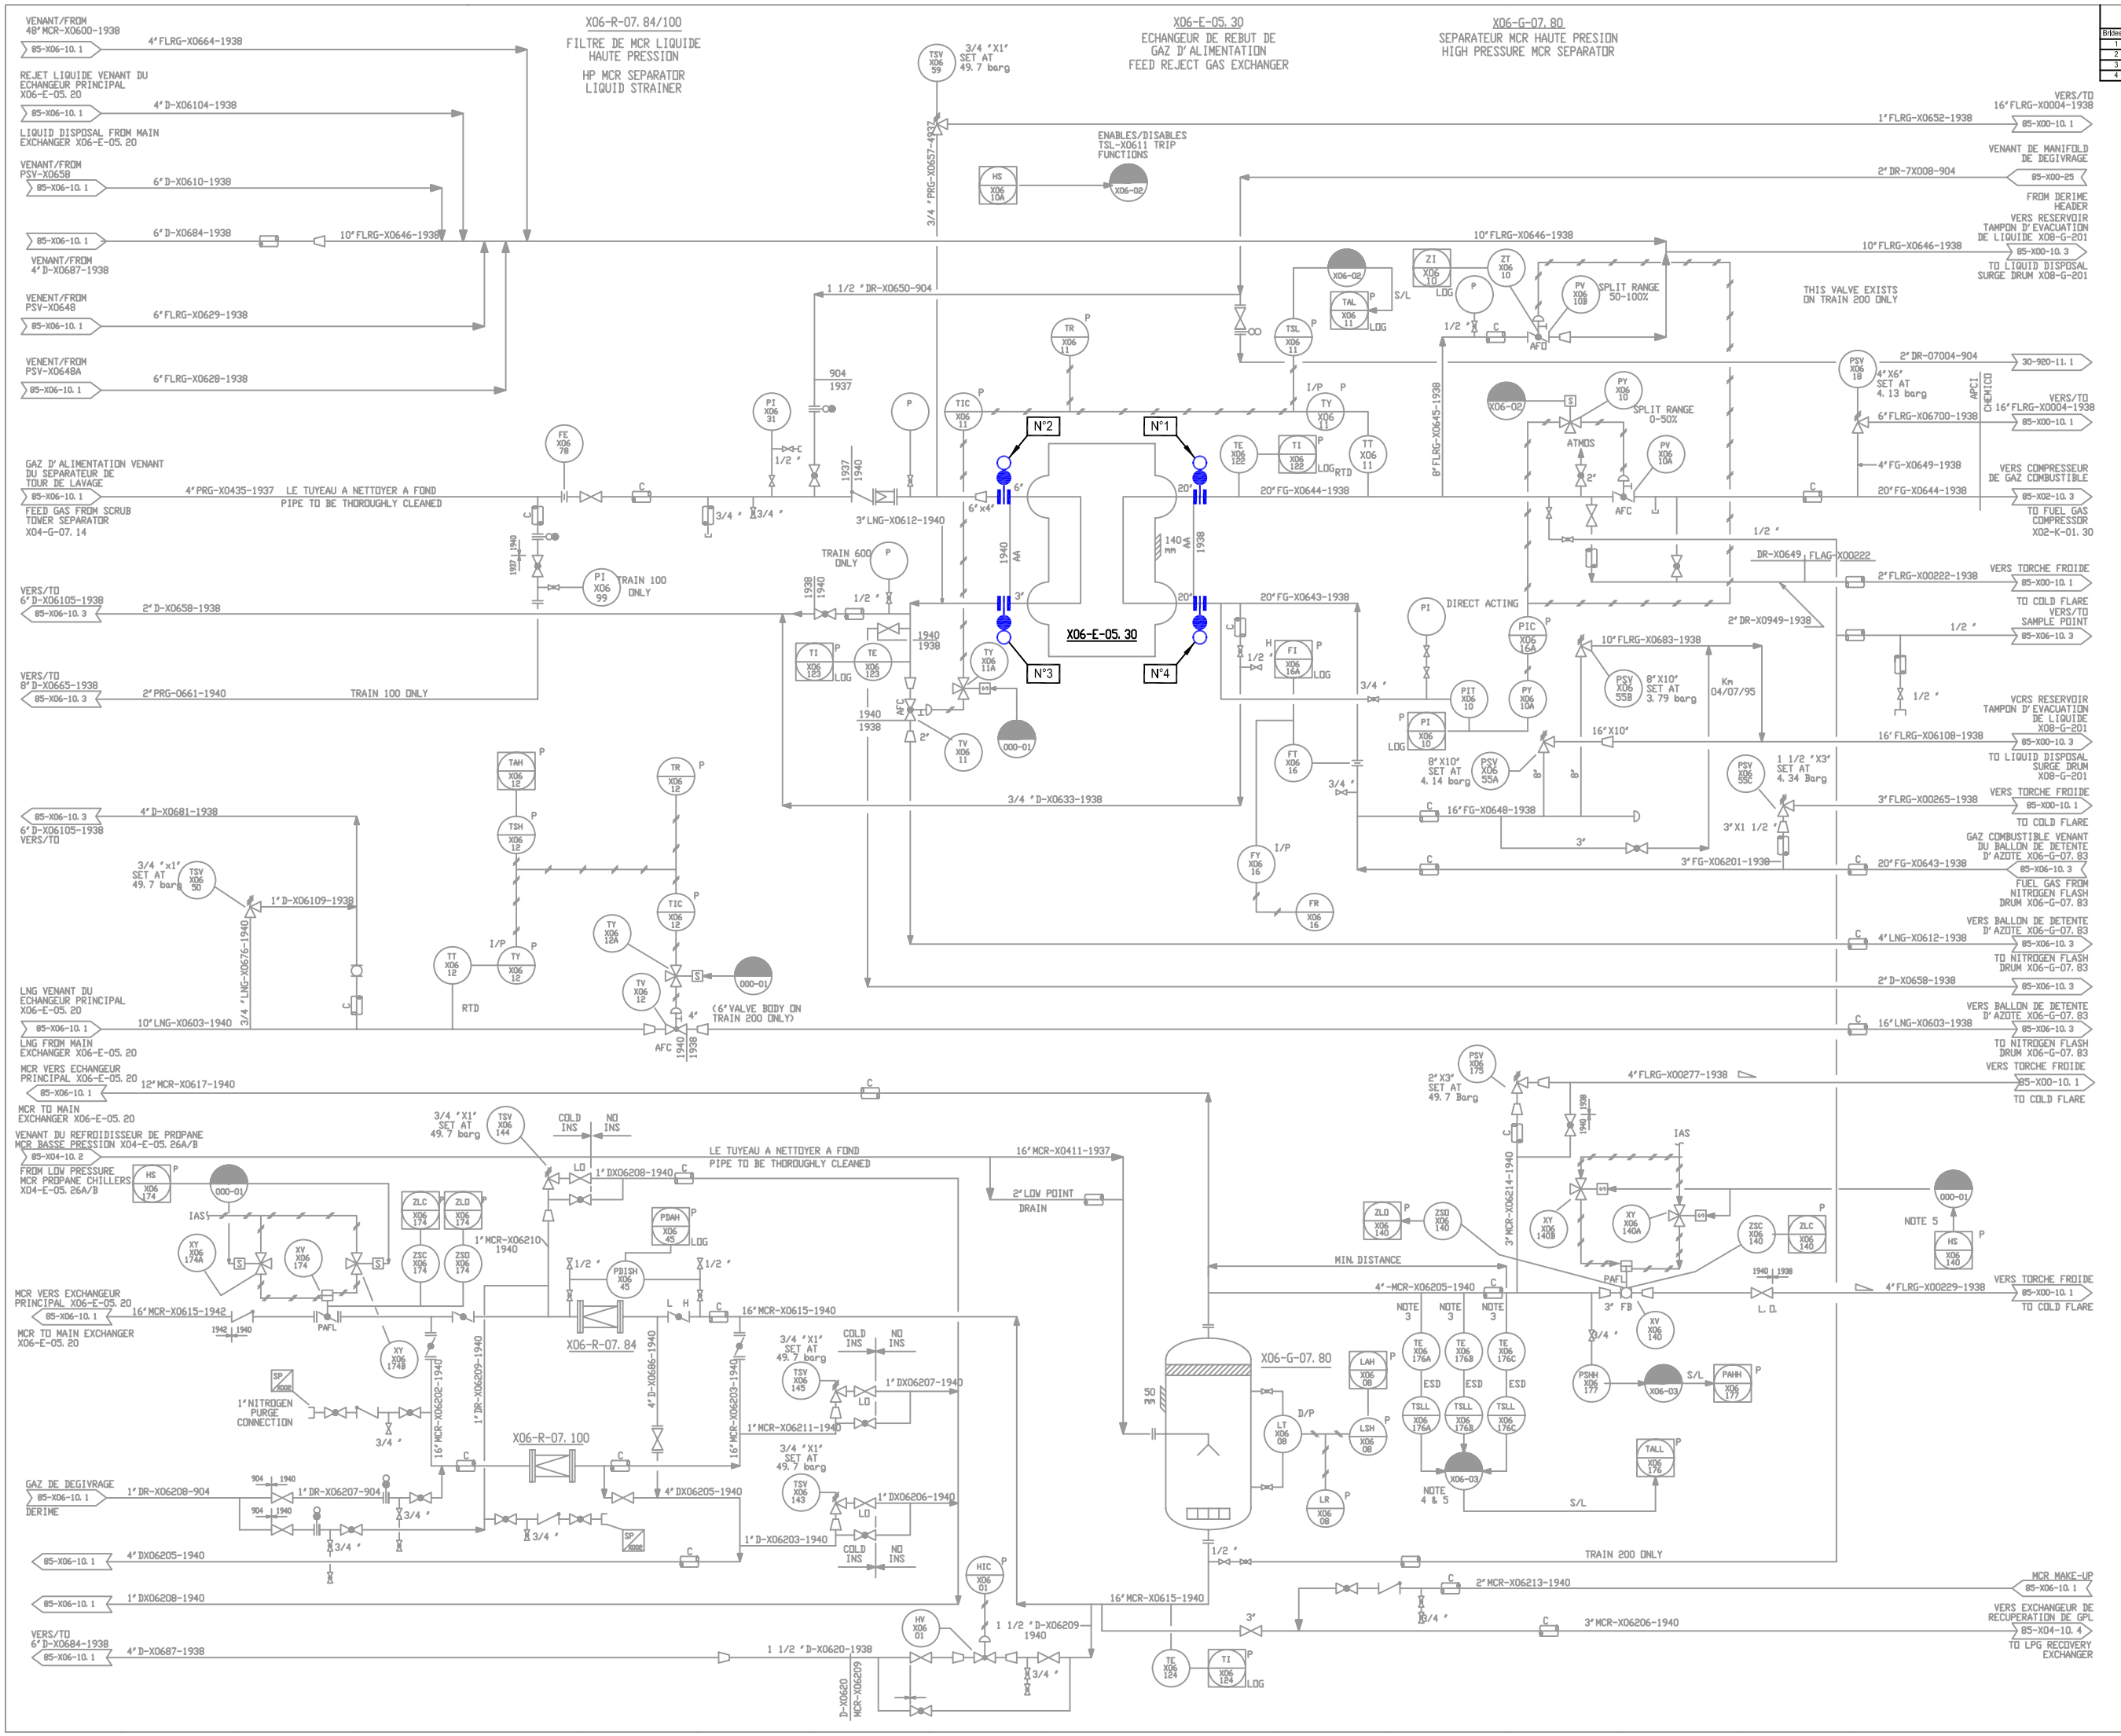

LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

Brides N°	Localisation du plan de bride	N° de ligne	Spec.	Diam. de la bride	Observation
1	Ligne FG vers K-01.30	20"PRG-X0644	1938	20"	
2	Gaz d'alimentation venant du G-07.14	4"PRG-X0435	1940	6"	
3	Ligne GNL vers G-07.83	4"LNG-X0612	1940	3"	
4	Entrée fuel gaz vers E-05.30	20"FG-X0643	1938	20"	

PLAN DE REFERENCE

P&ID 85-X06-10.2

REV.	DATE	REVISION	BY	CHK	OPTG REPV	DESN ENGR	PROJ ENGR	CLIENT
0	21-05-2005	EMIS POUR INSTALLATION	BB					

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B.BOURA — VERIFIE / CHECKED:

S O N A T R A C H
ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIE

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINT PLEINS DE L'ECHANGEUR XO6-E-05.30

JOB N°	DRAWING N°	REV.
T-1087	DS X06-E-05.30	0

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DE L'ECHANGEUR (X06-E-05.30) POUR TRAVAUX & INSPECTION

Bride N°	Localisation du plan de bride	N° de Ligne	Spécification des brides	Dimensions des brides	Observations	P&ID N°
1	Ligne FG vers K-01.30	20"FG-X0644	1938	20"		85-X06-10.2
2	Gaz d'alimentation venant du G-07.14	4"PRG-X0435	1940	6"		85-X06-10.2
3	Ligne GNL vers G-07.83	4"LNG-X0612	1940	3"		85-X06-10.2
4	Entrée fuel gaz vers E-05.30	20"FG-X0643	1938	20"		85-X06-10.2

	DATE	SIGNATURE
DEPARTEMENT TECHNIQUE	05/05/2014	
DEPARTEMENT PRODUCTION	10/05/14	
