LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

Brides N°	Localisation du plan de bride	N° de ligne	Spec.	Observation
1	Tête G-07.80	12"MCR-X0617	1940	Brider au niveau de la tubulure du ballon
2	Fond G-07.80	16"MCR-X0615	1940	Brider au niveau de la tubulure du ballon
3	Alimentation G-07.80	16"MCR-X0411	1937	Brider au niveau de la tubulure du ballon

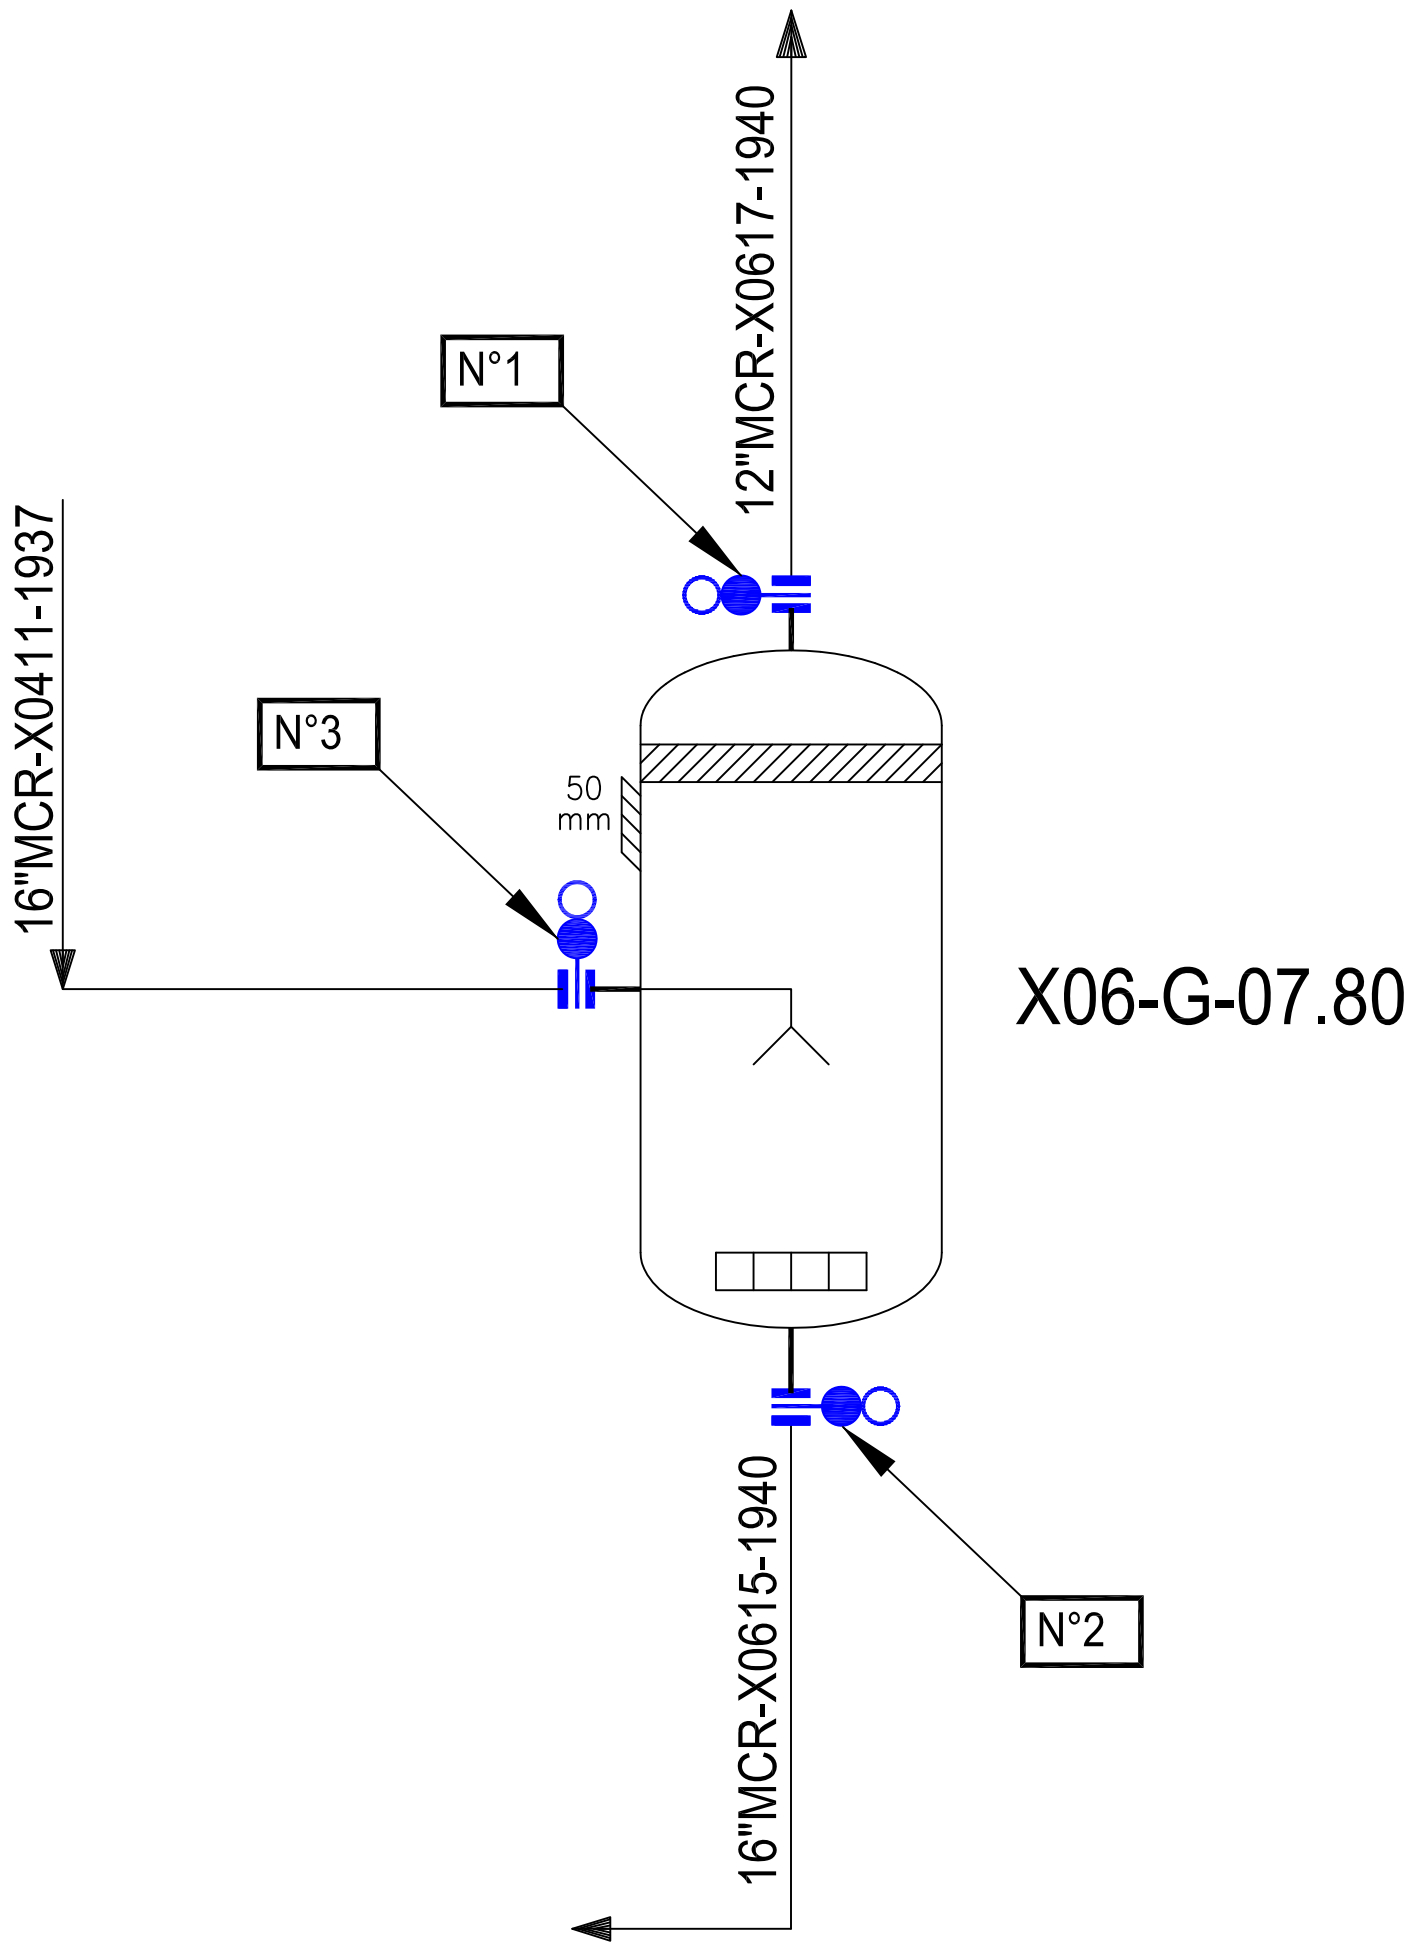

PLAN DE REFERENCE

P&ID 85-X06-10.2

REV.	DATE	REVISION	BY	CH'K	DFTG SUPV	DES'N ENG'R	PROJ ENG'R	CLIENT
0	22-06 2004	EMIS POUR INSTALLATION	BB					

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B.BOURA — VERIFIE / CHECKED

S O N A T R A C H

ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

ISOLEMENT PAR SPECTACLE BLIND
POUR PENETRATION
DU X06-G-07.80

JOB N°	DRAWING N°	REV.
T-1087	DS X06-G-07.80	0

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DU BALLON X06-G-07.80 POUR TRAVAUX & INSPECTION

Bride N°	Localisation du Plan de Bride	N° de Ligne	Spécification des brides	Dimensions des brides	Observations	P&ID N°
1	Tête G-780	12"MCR-X0617	1940	12"		85-X06-10.2
2	Fond G-780	16"MCR-X0615	1940	16"		85-X06-10.2
3	Alimentation G-780	16"MCR-X0411	1937	16"		85-X06-10.2

	DATE	SIGNATURE
DEPARTEMENT TECHNIQUE	11/05/2014	
DEPARTEMENT PRODUCTION	11/05/14	
