## LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

| Brides N° | Localisation du plan de bride | N° de ligne | Spec. | Observation |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tête F-721 | 4"M-X0701 | 1940 | Brider au niveau de la tubulure du F-721 |
| 2 | Reflux vers F-721 | 2"M-X0704 | 1940 | Brider au niveau de la tubulure du F-721 |
| 3 | F-721 vers torche | 1"FLRG-X0705 | 1938 | |
| 4 | Fond E-723 vers F-721 | 4"PTR-X0706 | 904 | Brider au niveau de la tubulure du F-721 |
| 5 | Fond F-721 vers F-730 | 4"PTR-X0703 | 904 | Brider au niveau de la tubulure du F-721 |
| 6 | Fond F-711 vers E-723 | 6"PTR-X0701 | 904 | Brider au niveau de la tubulure du F-721 |
| 7 | Retour E-723 vers F-721 | 4"PTR-X0702 | 904 | Brider au niveau de la tubulure du E-723 |
| 8 | Alimentation F-721 | 3"PTR-X0416 | 904 | Brider au niveau de la tubulure du F-721 |

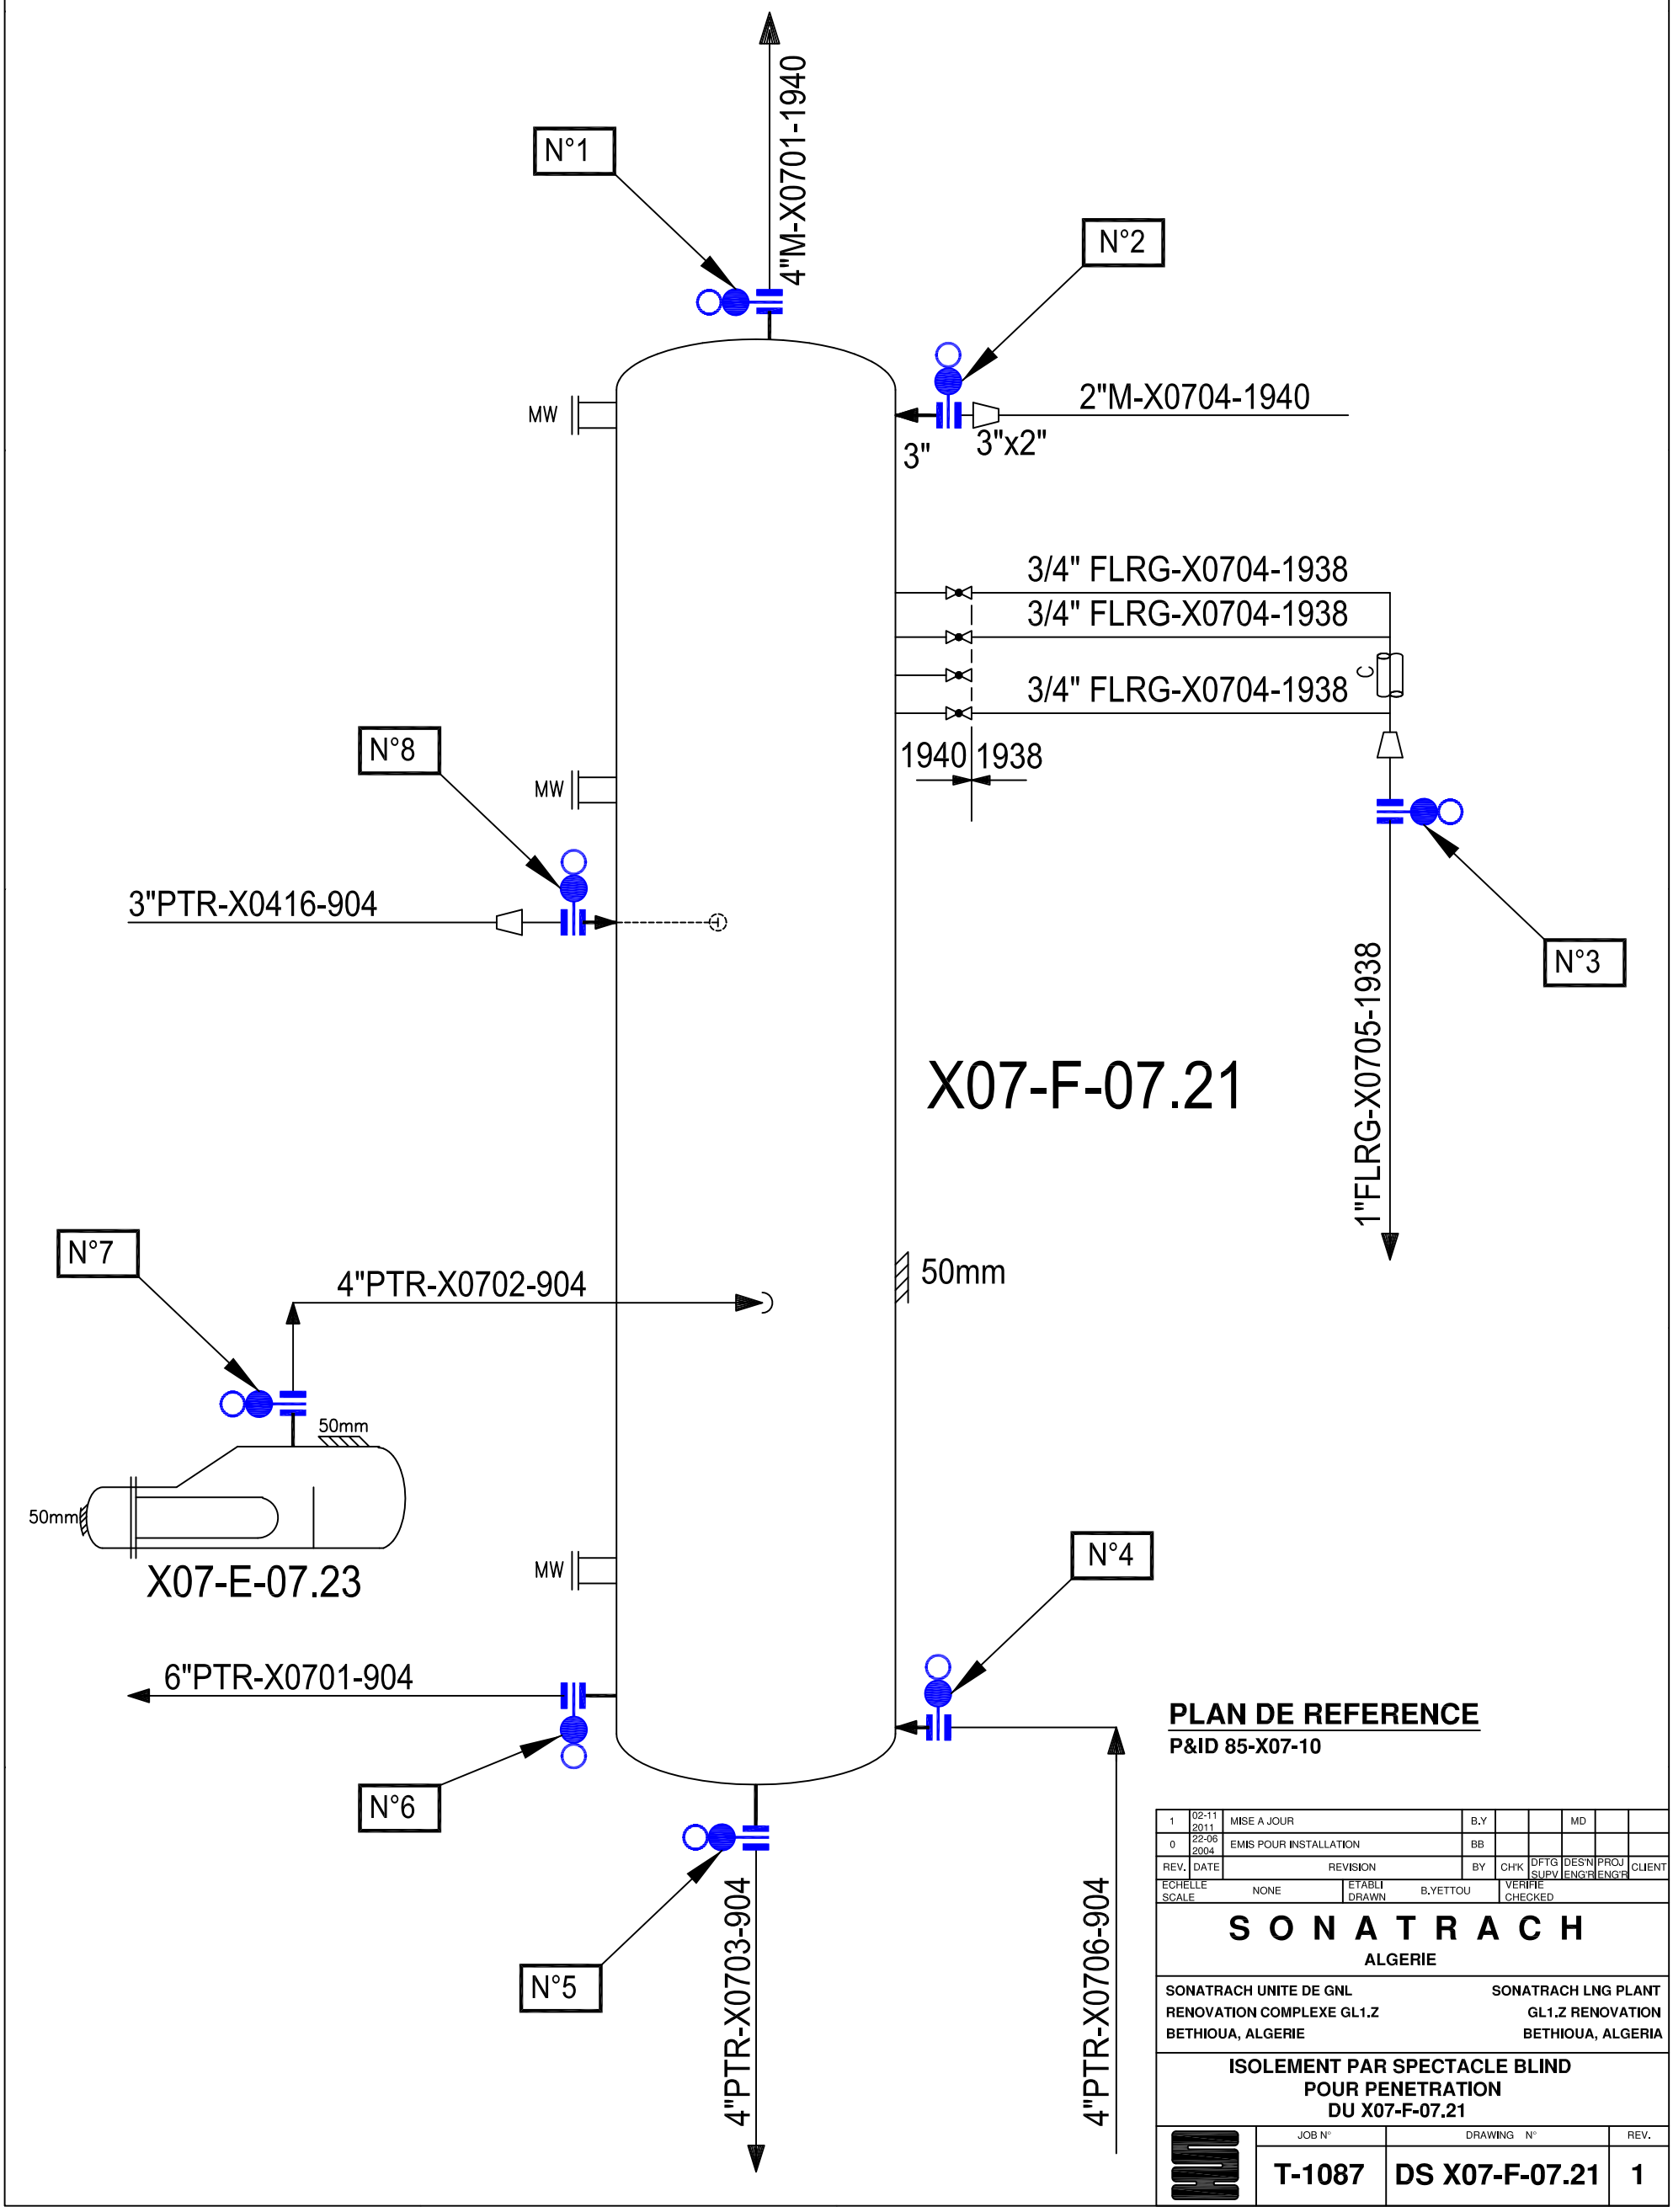


**PLAN DE REFERENCE**
**P&ID 85-X07-10**

| REV. | DATE | REVISION | BY | CH'K | DFTG SUPV | DES'N ENG'R | PROJ ENG'R | CLIENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-11 2011 | MISE A JOUR | B.Y | | | MD | | |
| 0 | 22-06 2004 | EMIS POUR INSTALLATION | BB | | | | | |

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B.YETTOU — VERIFIE / CHECKED:

**S O N A T R A C H**
**ALGERIE**

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

**ISOLEMENT PAR SPECTACLE BLIND POUR PENETRATION DU X07-F-07.21**

| JOB N° | DRAWING N° | REV. |
|---|---|---|
| T-1087 | DS X07-F-07.21 | 1 |

# PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DE LA COLONNE (X07-F-07.21) POUR TRAVAUX & INSPECTION

| Bride N° | Localisation du plan de bride | N° de Ligne | Spécification des brides | Dimensions des Brides pleines | Observations | P&ID N° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tête F-721 | 4"M-X0701 | 1940 | 4" | | 85-X07.10 |
| 2 | Reflux vers F-721 | 2"M-X0704 | 1940 | 3" | | 85-X07.10 |
| 3 | F-721 vers torche | 1"FLRG-X0705 | 1938 | 1" | | 85-X07.10 |
| 4 | Fond E-723 vers F-721 | 4"PTR-X0706 | 904 | 4" | | 85-X07.10 |
| 5 | Fond F-721 vers E-730 | 4"PTR-X0703 | 904 | 4" | | 85-X07.10 |
| 6 | Fond F-711 vers E-723 | 6"PTR-X0701 | 904 | 6" | | 85-X07.10 |
| 7 | Retour E-723 vers F-721 | 4"PTR-X0702 | 904 | 4" | | 85-X07.10 |
| 8 | Entrée F- 721 | 3" PTR-X0416 | 904 | 3" | | 85-X07.10 |

| | DATE | SIGNATURE |
|---|---|---|
| DEPARTEMENT TECHNIQUE | 11/05/2014 | |
| DEPARTEMENT PRODUCTION | 11/05/14 | |
