LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

Brides N°	Localisation du plan de bride	N° de ligne	Spec.	Observation
1	Tête F-07.31	6"E-X0801	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
2	Reflux vers F-07.31	3"E-X0805	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
3	Fond F-07.31 vers F-07.41	4"PTR-X0801	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
4	Fond F-07.31 vers F-07.33	8"PTR-X0809	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne
5	Retour E-07.33 vers F-07.31	14"	904	Brider au niveau de la tubulure de la colonne

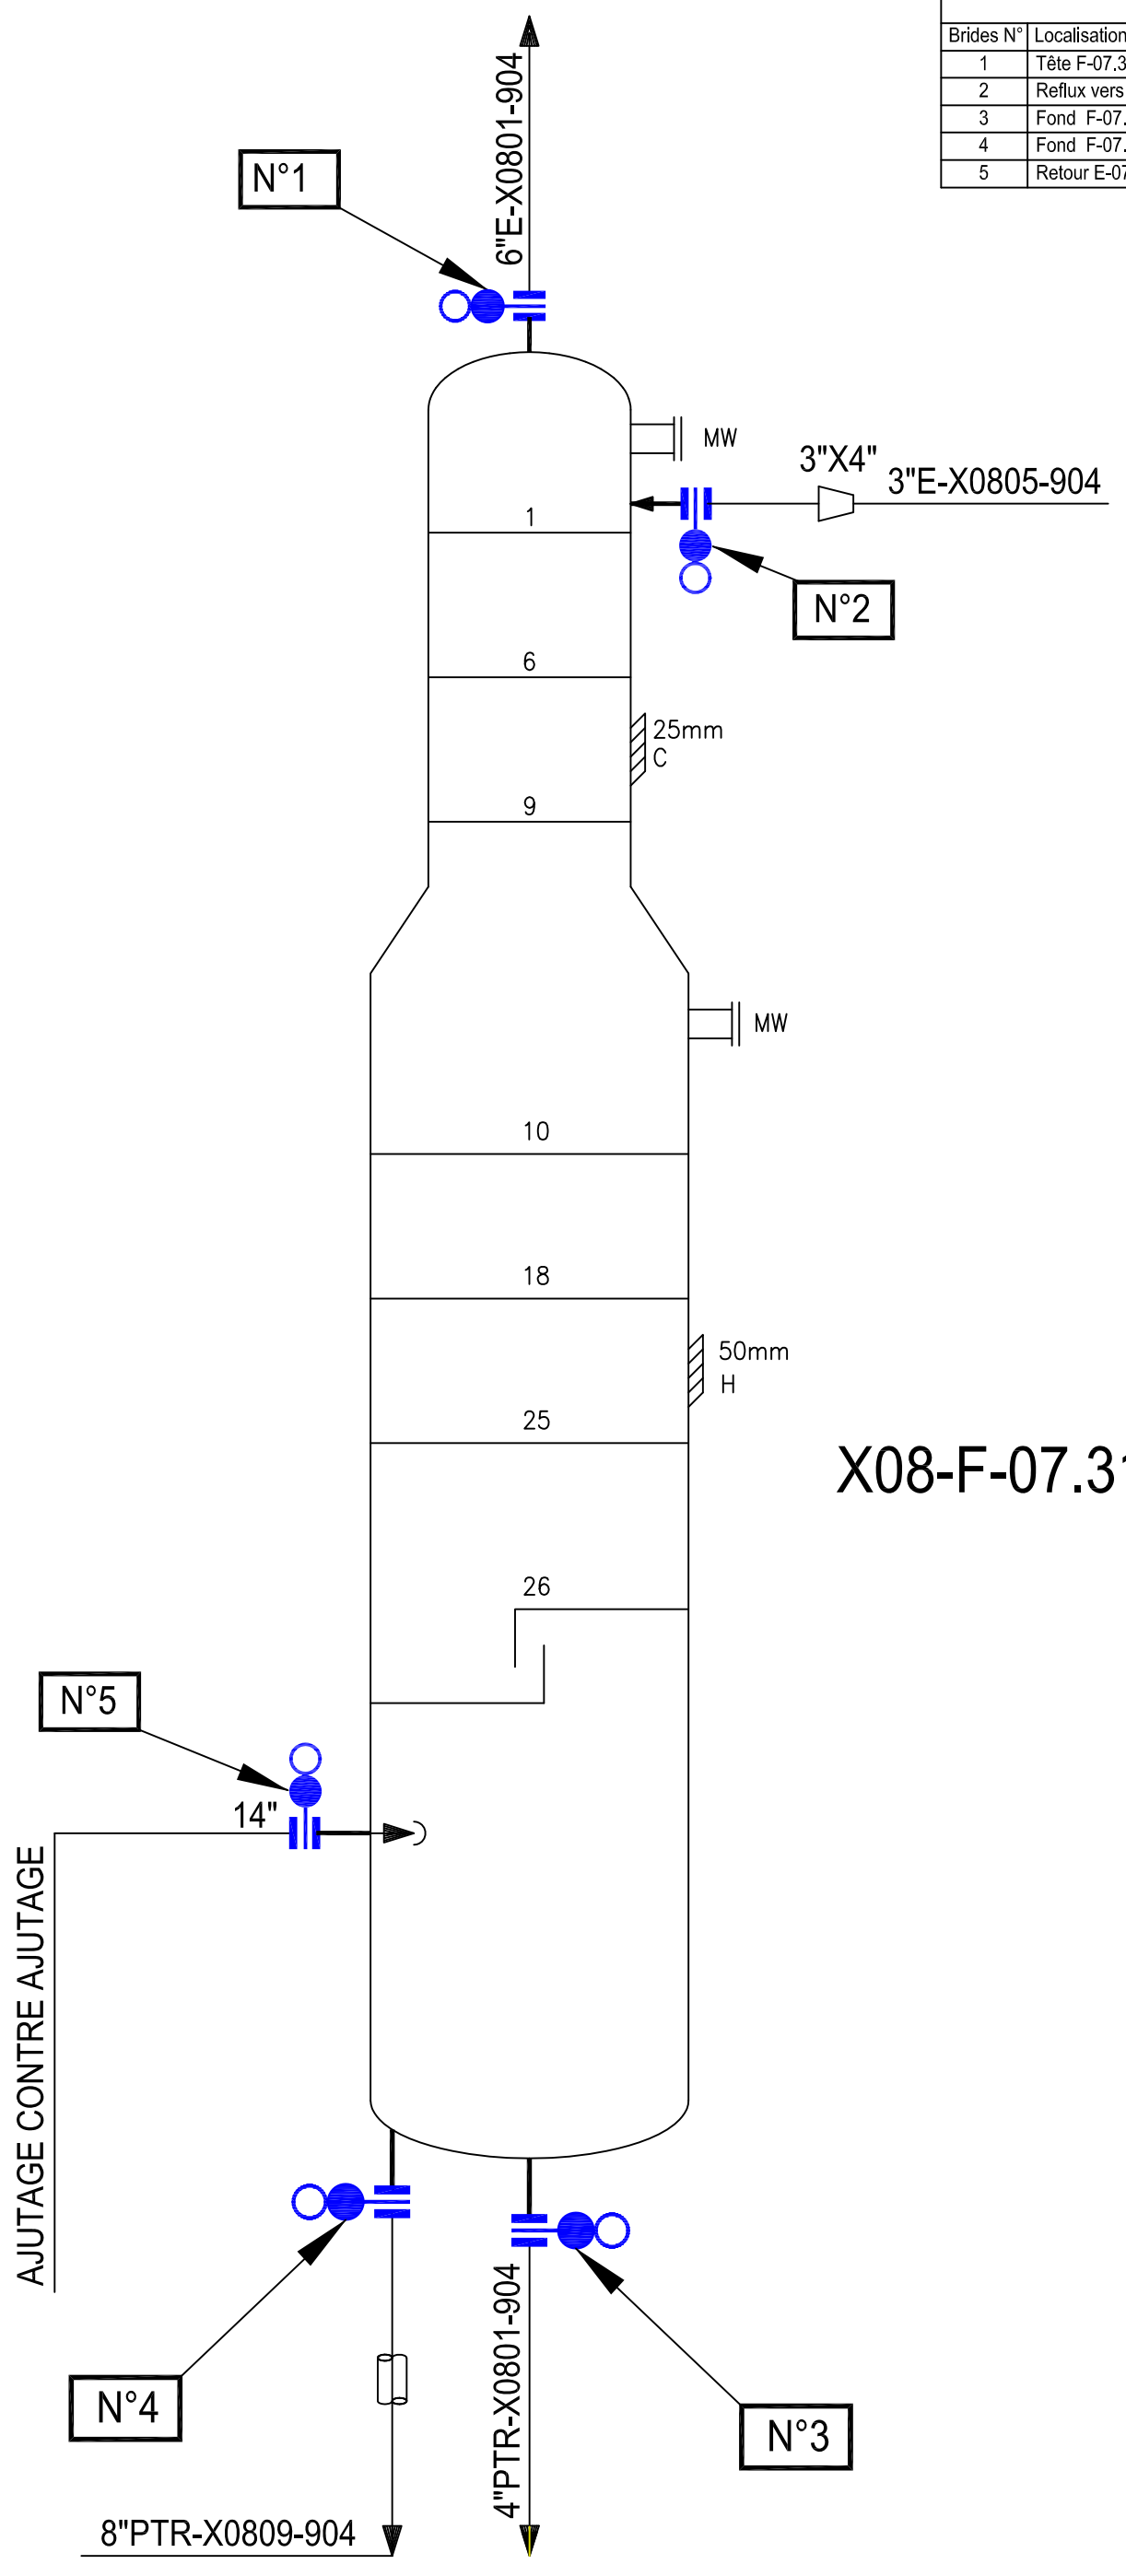

PLAN DE REFERENCE

P&ID 85-X08-10

REV.	DATE	REVISION	BY	CH'K	DFTG SUPV	DES'N ENG'R	PROJ ENG'R	CLIENT
1	02-11 2011	MISE A JOUR	B.Y			MD		
0	07-02 2004	EMIS POUR INSTALLATION	BB					

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B.BOURA — VERIFIE / CHECKED:

S O N A T R A C H

ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

ISOLEMENT PAR SPECTACLE BLIND POUR PENETRATION DU X08-F-07.31

JOB N°	DRAWING N°	REV.
T-1087	DS X08-F-07.31	1

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DE LA COLONNE (X08-F-07.31) POUR TRAVAUX & INSPECTION

Bride N°	Localisation du plan de Bride	N° de Ligne	Spécification des brides	Dimensions des brides	Observations	P&ID N°
1	Tête F-731	6"E-X0801	904	6"		85-X08-10
2	Reflux vers F-731	3"E-X0805	904	4"		85-X08-10
3	Fond F-731 vers F-741	4"PTR-X0801	904	4"		85-X08-10
4	Fond F-731 vers E-733	8"PTR-X0809	904	8"		85-X08-10
5	Retour E-733 vers F-731	14"	904	14"		85-X08-10

	DATE	SIGNATURE
DEPARTEMENT TECHNIQUE	11/05/2014	
DEPARTEMENT PRODUCTION	11/05/14	
