LISTE DES BRIDES D'ISOLEMENT

Brides N°	Localisation du plan de bride	N° de ligne	Spec.	Observation
1	Tête G-07.83	20"FG-X0643	1938	Brider au niveau de la tubulure du ballon
2	Fond G-07.83	16"LNG-X0604	1938	Brider au niveau de la tubulure du ballon
3	Alimentation G-07.83	16"LNG-X0603	1938	Brider au niveau de la tubulure du ballon

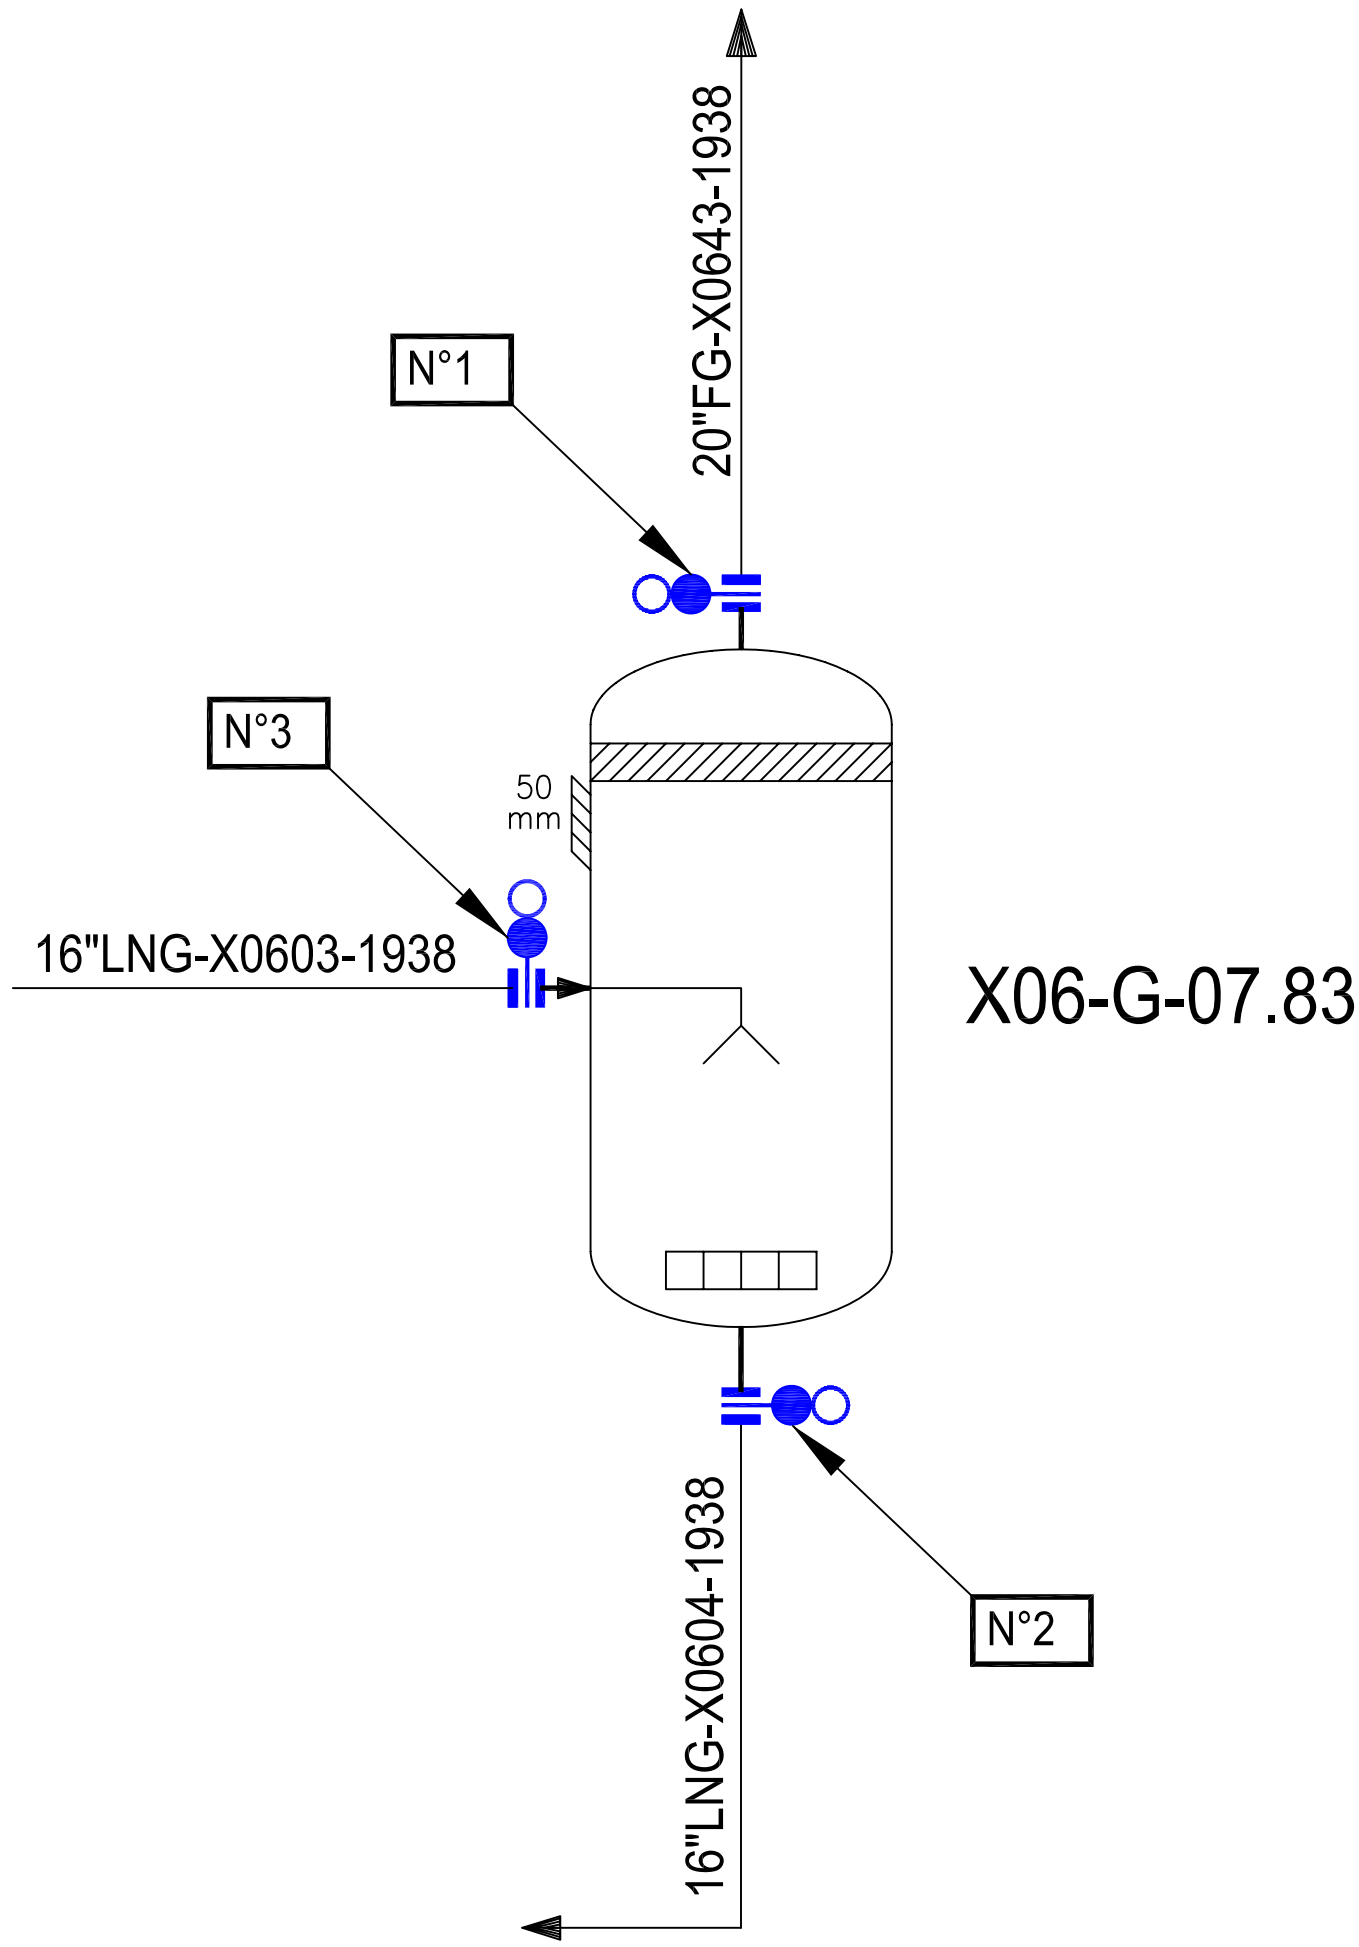

PLAN DE REFERENCE

P&ID 85-X06-10.3

REV.	DATE	REVISION	BY	CH'K	DFTG SUPV	DES'N ENG'R	PROJ ENG'R	CLIENT
0	22-06 2004	EMIS POUR INSTALLATION	BB					

ECHELLE / SCALE: NONE — ETABLI / DRAWN: B.BOURA — VERIFIE / CHECKED:

S O N A T R A C H

ALGERIE

SONATRACH UNITE DE GNL
RENOVATION COMPLEXE GL1.Z
BETHIOUA, ALGERIE

SONATRACH LNG PLANT
GL1.Z RENOVATION
BETHIOUA, ALGERIA

ISOLEMENT PAR SPECTACLE BLIND POUR PENETRATION DU X06-G-07.83

JOB N°	DRAWING N°	REV.
T-1087	DS X06-G-07.83	0

PROCEDURE DE MISE SOUS JOINTS PLEINS DU BALLON X06-G-07.83 POUR TRAVAUX & INSPECTION

Bride N°	Localisation du Plan de Bride	N° de Ligne	Spécification des brides	P&ID N°
1	Tête G-783	20"FG-X0643	1938	DS 85-X06-G-07.83 REV 0
2	Fond G-783	16"LNG-X0604	1938	DS 85-X06-G-07.83 REV 0
3	Alimentation G-783	16"LNG-X0603	1938	DS 85-X06-G-07.83 REV 0

	DATE	SIGNATURE
DEPARTEMENT TECHNIQUE	11/05/2014	
DEPARTEMENT PRODUCTION	11/05/14	
